

Zeitschrift: Der Münsterausbau in Bern : Jahresbericht
Herausgeber: Münsterbauverein
Band: 18 (1905)

Artikel: Bericht über die Arbeiten des XVIII. Baujahres
Autor: Indermühle, Karl
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-403183>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Bericht

über

die Arbeiten des XVIII. Baujahres

(1. Januar 1904 bis 31. Dezember 1904).

In der Bauhütte waren im Laufe des Jahres beschäftigt:

	1. Januar	1. Juli	31. Dezember
Steinhauerpolier	1	1	1
Steinhauer	4	3	7
Bildhauer	3	—	—
Maurerpolier	1	1	1
Maurer	1	—	1
Handlanger	1	1	2
Schmiede	1	1	—

Die Arbeiten dieses Jahres betrafen zur Hauptsache die schon im Vorjahre begonnenen Restaurationen am nördlichen Hochschiff.

Die Behandlung war dieselbe wie bei den früher restaurierten Partien am südlichen Hochschiff. (Siehe Jahresbericht über 1902 und 1903.) Die Maurer konnten am Anfang des Jahres mit verschiedenen Arbeiten auf Rechnung der Kirchenverwaltung beschäftigt werden bis genügend Werkstücke zum Versetzen bereit lagen.

Von Mitte April ab wurde ungehindert an der Fertigstellung der vorgesehenen Arbeiten am nördl. Hochschiff gearbeitet.

Restauriert und gleichzeitig rekonstruiert wurden sieben Galerien mit ihren Anhängern, sechs Galerien mit Gesimsen, Masswerken und Wasserspeiern, sowie der obere Teil des Treppentürmchens, welches zum Hochschiffdachboden führt. Anfangs Dezember konnte mit dem Hauen der Werkstücke für die Galerien und Fialen auf der Westseite ob den Eingangshallen begonnen werden, nachdem, um die Zeit zu füllen, aber hauptsächlich um die Kasse zu schonen, einige Arbeiten für Dritte ausgeführt worden waren, so die Einfassung für eine neue Schaufensteranlage an der Kramgasse, ein Hausportal für einen Privaten, ein Taufstein nach Röthenbach und einige Kleinigkeiten. Ende Dezember wurde der Abbruch des Hochschiffgerüsts vollendet und in den letzten Tagen des Jahres das Gerüst am Wappenfeiler erstellt, für die nächsthin zu beginnende Fertigstellung desselben. Das neue Jahr ist nun einer neuen Arbeit gewidmet, der vorerwähnten Restauration an der Westseite, welche noch in demselben voraussichtlich fertig wird.

Zur Vervollständigung folgen die genaueren Daten:

14. April. Mit dem Versetzen der Werkstücke auf auf der Nordseite der Hochschiffgalerie begonnen.


4. Mai. Wasserspeier II (Stelzmann) versetzt.

17. Mai. Wasserspeier III (Hirsch) versetzt.

9. Juni. Wasserspeier IV (Wasserfrau) versetzt.

26. Juni. Wasserspeier VII (Mann mit Zahnschmerzen) versetzt.

6. Juli. Mit dem Abbruch des Treppentürmchens begonnen.

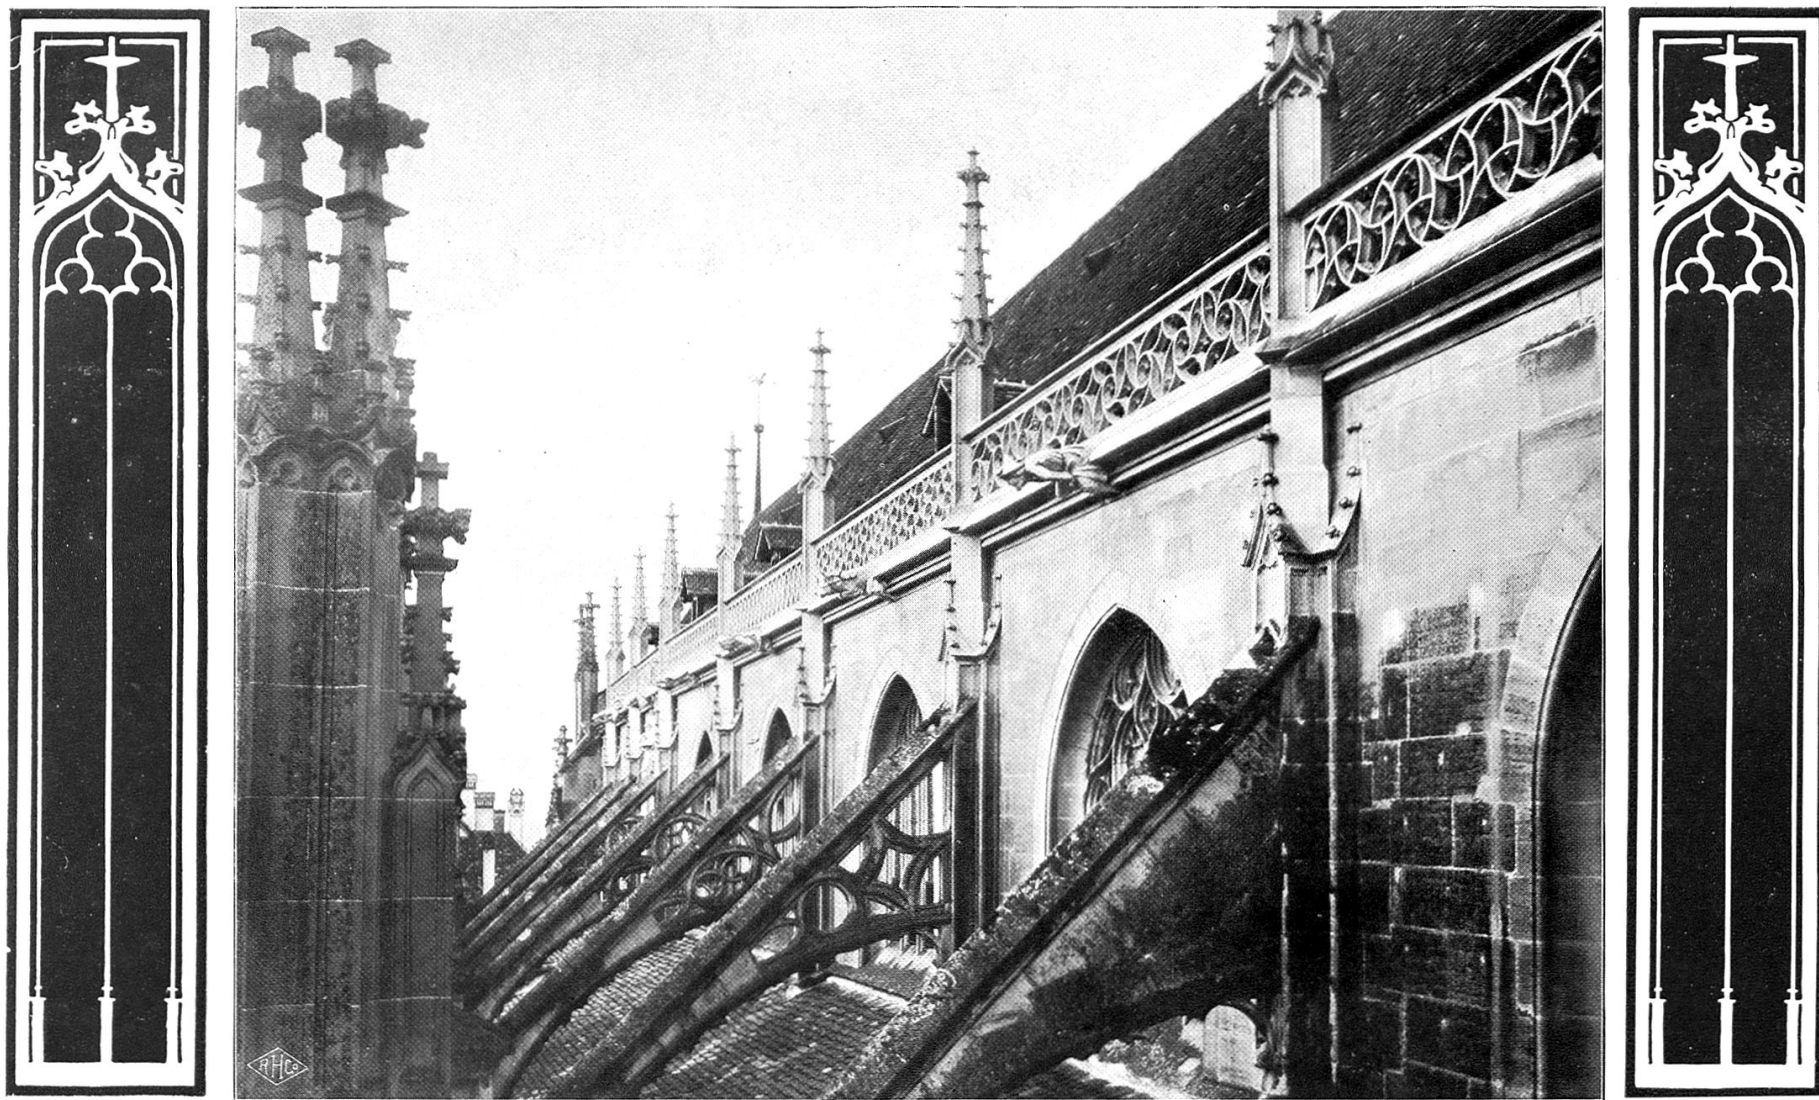

Rekonstruktion der Nördlichen Hochschiffgalerie.

11. *Juli*. Fiale I fertig versetzt (die Numerierung der Gruppen und Werkstücke geht vom Turme nach dem Chor).

8. *August*. Wasserspeier V (Vogel) versetzt.

29. *August*. Fiale II fertig versetzt.

3. *September*. Fiale III fertig versetzt.

10. *September*. Fiale IV fertig versetzt.

4. *Oktober*. Fiale VII fertig versetzt.

10. *Oktober*. Fiale VI fertig versetzt.

12. *November*. Fiale V fertig versetzt.

16. *November*. Wasserspeier VI (Mann mit Leibschermerzen) versetzt.

29. *November*. Treppentürmchen fertig versetzt.

5. *Dezember*. Mit dem Hauen der Werksteine für die Galerien der Westseite begonnen.

6. *Dezember*. Mit Abbrechen des Gerüstes am nördl. Hochschiff begonnen.

20. *Dezember*. Gerüstabbruch beendet und damit die Arbeit an den Fialen und Galerien des nördlichen Hochschiffes.

21. *Dezember*. Gerüst für den Wappeneiferer begonnen.

Bern, im Juli 1905.

Karl Indermühle, Architekt.
