

Bericht über die Arbeiten des XVIII. Baujahres

Autor(en): **Indermühle, Karl**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Der Münsterausbau in Bern : Jahresbericht**

Band (Jahr): **18 (1905)**

PDF erstellt am: **16.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-403183>

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Bericht

über

die Arbeiten des XVIII. Baujahres

(1. Januar 1904 bis 31. Dezember 1904).

In der Bauhütte waren im Laufe des Jahres beschäftigt:

	1. Januar	1. Juli	31. Dezember
Steinhauerpolier	1	1	1
Steinhauer	4	3	7
Bildhauer	3	—	—
Maurerpolier	1	1	1
Maurer	1	—	1
Handlanger	1	1	2
Schmiede	1	1	—

Die Arbeiten dieses Jahres betrafen zur Hauptsache die schon im Vorjahre begonnenen Restaurationen am nördlichen Hochschiff.

Die Behandlung war dieselbe wie bei den früher restaurierten Partien am südlichen Hochschiff. (Siehe Jahresbericht über 1902 und 1903.) Die Maurer konnten am Anfang des Jahres mit verschiedenen Arbeiten auf Rechnung der Kirchenverwaltung beschäftigt werden bis genügend Werkstücke zum Versetzen bereit lagen.

Von Mitte April ab wurde ungehindert an der Fertigstellung der vorgesehenen Arbeiten am nördl. Hochschiff gearbeitet.

Restauriert und gleichzeitig rekonstruiert wurden sieben Galerien mit ihren Anhängern, sechs Galerien mit Gesimsen, Masswerken und Wasserspeiern, sowie der obere Teil des Treppentürmchens, welches zum Hochschiffdachboden führt. Anfangs Dezember konnte mit dem Hauen der Werkstücke für die Galerien und Fialen auf der Westseite ob den Eingangshallen begonnen werden, nachdem, um die Zeit zu füllen, aber hauptsächlich um die Kasse zu schonen, einige Arbeiten für Dritte ausgeführt worden waren, so die Einfassung für eine neue Schaufensteranlage an der Kramgasse, ein Hausportal für einen Privaten, ein Taufstein nach Röthenbach und einige Kleinigkeiten. Ende Dezember wurde der Abbruch des Hochschiffgerüsts vollendet und in den letzten Tagen des Jahres das Gerüst am Wappenpfeiler erstellt, für die nächsthin zu beginnende Fertigstellung desselben. Das neue Jahr ist nun einer neuen Arbeit gewidmet, der vorerwähnten Restauration an der Westseite, welche noch in demselben voraussichtlich fertig wird.

Zur Vervollständigung folgen die genaueren Daten:

14. April. Mit dem Versetzen der Werkstücke auf auf der Nordseite der Hochschiffgalerie begonnen.


4. Mai. Wasserspeier II (Stelzmann) versetzt.

17. Mai. Wasserspeier III (Hirsch) versetzt.

9. Juni. Wasserspeier IV (Wasserfrau) versetzt.

26. Juni. Wasserspeier VII (Mann mit Zahnschmerzen) versetzt.

6. Juli. Mit dem Abbruch des Treppentürmchens begonnen.

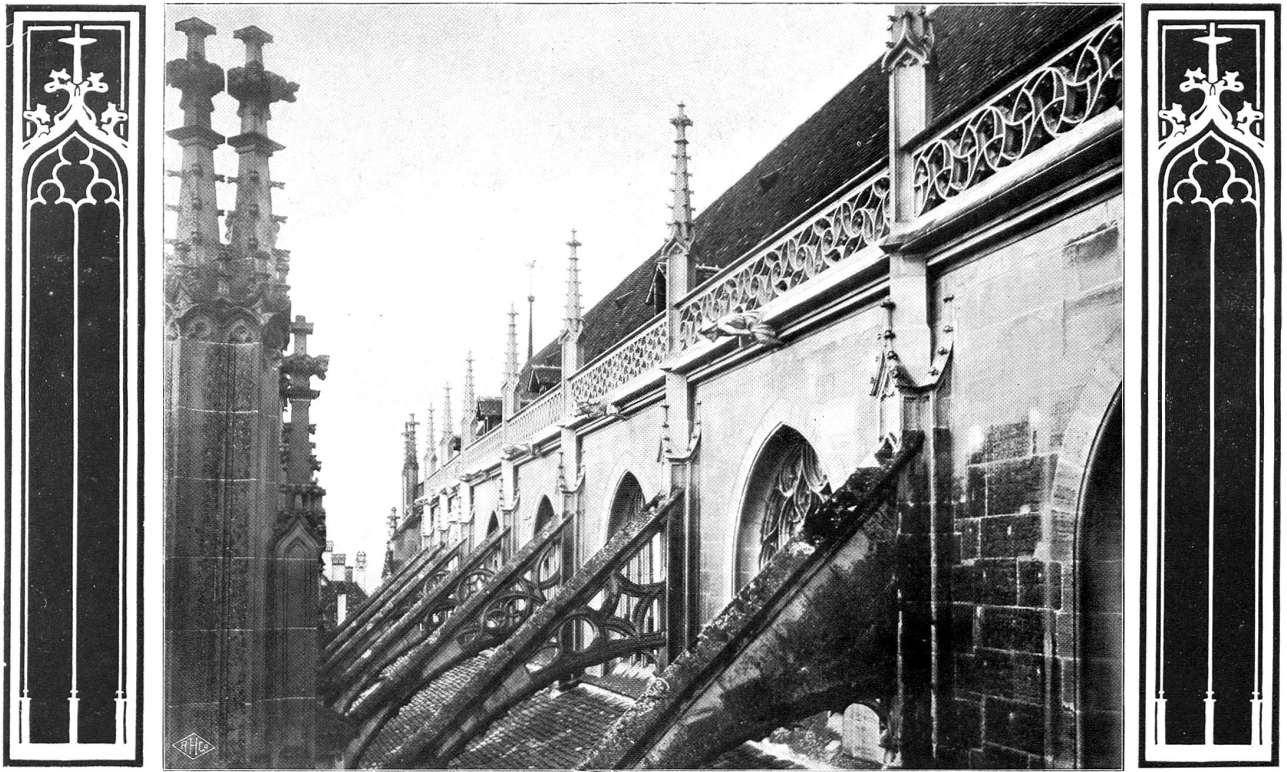

Rekonstruktion der Nördlichen Hochschiffgalerie.

11. *Juli*. Fiale I fertig versetzt (die Numerierung der Gruppen und Werkstücke geht vom Turme nach dem Chor).

8. *August*. Wasserspeier V (Vogel) versetzt.

29. *August*. Fiale II fertig versetzt.

3. *September*. Fiale III fertig versetzt.

10. *September*. Fiale IV fertig versetzt.

4. *Oktober*. Fiale VII fertig versetzt.

10. *Oktober*. Fiale VI fertig versetzt.

12. *November*. Fiale V fertig versetzt.

16. *November*. Wasserspeier VI (Mann mit Leibscherzen) versetzt.

29. *November*. Treppentürmchen fertig versetzt.

5. *Dezember*. Mit dem Hauen der Werksteine für die Galerien der Westseite begonnen.

6. *Dezember*. Mit Abbrechen des Gerüstes am nördl. Hochschiff begonnen.

20. *Dezember*. Gerüstabbruch beendet und damit die Arbeit an den Fialen und Galerien des nördlichen Hochschiffes.

21. *Dezember*. Gerüst für den Wappenpfeiler begonnen.

Bern, im Juli 1905.

Karl Indermühle, Architekt.
