Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home :

internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 20 (1966)

Heft: 11: Industrielles Bauen, Vorfabrikation, Montagebau = Construction

industrielle, fabrication d'éléments préfabriqués, montage = Industrialized construction, prefabrication assembly construction

Artikel: Überbauung Grüzefeld, Winterthur = Groupe de bâtiments Gruzefeld.

Winterthour = Grüzefeld building complex, Winterthur

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-332626

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Architekten: Claude Paillard und Peter Leemann im Atelier CJP (Cramer, Jaray, Paillard und Leemann), Zürich und Winterthur Ingenieure: Widmer und Wädensweiler, Winterthur

Überbauung Grüzefeld, Winterthur

Bauzeit: 1965-67

Groupe de bâtiments Gruzefeld, Winterthour

Grüzefeld Building Complex, Winterthur

Bauvolumen: 370 Wohnungen, Nebenanlagen, Lebensmittelladen, gewerbliche Räume: total ca 135 000 m³

1961 ab 1962 Wetthewerbsentscheidung: Projektierung: Baugenehmigung: 1964 Baugenenmigung: Kreditabstimmung zur Finanzierung: Baubeginn: Voraussichtliche Fertigstellung: Februar 1965 März 1965 Ende 1967

Vorbemerkung

In einem Heft über Präfabrikation nimmt das Kapitel Wohnungsbau einen besonderen Raum ein.

Es gibt schon eine ganze Reihe von Firmen, die Bausysteme für Wohnungen in ein- und mehrgeschossiger Bauweise anbieten. Es gibt auch schon ein paar Architektenbüros, die in diese Entwicklung steuernd eingreifen, eigene Systeme entwickeln und Forderungen an die Herstellerfirmen stellen.

In fast allen Fällen besagen Kalkulation und Endabrechnung, daß das Bauen mit vorgefertigten Teilen erst ab einer gewissen Größenordnung billiger ist als das konventionelle Bauen. In vielen Fällen jedoch fällt der Wohnwert, der Komfort der Wohnungsanordnung, ihrer Lage und Einrichtung der angestrebten konstruktiven Vereinfachung zum Opfer. Privatheit, Individualität scheinen sich mit der Serienherstellung des Wohngebäudes und seiner massenweisen Montage nicht vereinbaren zu lassen. Der Verbraucher, der sich auf der einen Seite zu den Fortschritten des Raketenzeitalters bekennt, zieht andererseits das handgemauerte – in der Technik früherer Jahrhunderte erstellte – Wohnhaus vor, weil es eher seinen persönlichen Wünschen und Ansprüchen entgegenzukommen vermag. Die Frage, warum das so ist, scheint mir

nicht schwer zu beantworten. Die Frage, wer daran die Schuld trägt, ist nicht mit dem Hinweis auf einen Berufsstand zu erledigen. Weder die Architekten noch die Unternehmer, noch die Bauherren sind im allgemeinen zu bezichtigen: Der notwendige Denkprozeß zur Neuordnung dieser Probleme von seiten der Herstellung – ist erst in wenigen Köpfen vollzogen worden. Die technische Entwicklung hat die umfassende geistige Programmierung überrollt. Und hier hinken Forschung und Erziehung in Archi-tektenkreisen den technischen Schrittmachern gewaltig hinterher. Die Hersteller von vorfabrizierten Wohnungen versuchen sehr oft ihr Bausystem da, wo es paßt, auf den ihnen bekannten, gängigen Grundrissen aufzubauen, und da, wo es nicht paßt, Abstriche zu machen. Da sie sich für Raumbildungen im Äußeren und im Inneren nicht interessieren, versuchen sie, mit dem Argument der Wirtschaftlichkeit das System des Zeilenbaus entlang ihrer Kranbahnen durchzusetzen. Die Arbeit des Architekten darf sich aber nicht in der Auflockerung solcher überall anzutreffender Wohnkasernen erschöpfen, indem er sie im Kampf mit der Herstellerfirma ein bißchen vermenschlicht, verniedlicht. Er muß viel tiefer, viel früher ansetzen, im Bereich der Einzelwohnung, im Bereich des großen städtischen Wohnraumes. Es ist erwiesen, daß sich die Ansprüche, die Lebensweise, die soziale und altersmäßige Struktur der Familie in den letzten Jahrzehnten erheblich gewandelt haben. Es ist selbstverständlich, daß veränderte Gebrauchsansprüche veränderte Wohnformen

Zwangsläufig führt die zu leistende Arbeit zu neuartigen Wohngehäusen, die mit den Mitteln zeitgemäßer Präfabrikation herge-

Das Projekt Grüzefeld scheint ein ernsthafter Versuch zu sein, die aufgezeigten Probleme von Grund auf neu anzufassen und Schritt für Schritt zu bewältigen. Inwieweit die Architekten, Ingenieure und Baugesellschaften damit auf dem richtigen Wege sind, sei hier zur Diskussion gestellt.

Städtebauliche Anordnung

Das große, nahezu ebene Gelände wird durch wenige differenziert gestaltete Baublocks von großer Längenausdehnung und wechselnder Höhenentwicklung – von 2 bis 12 Geschossen – gegliedert. Es ergeben sich großzügige Freiräume, teilweise ineinander übergehend, teilweise über offene Durchgänge unter den Blocks miteinander verbunden. Das gesamte Projekt umfaßt vier große Baublocks (der Begriff Baublock wird hier und im Folgenden nicht im herkömmlichen Sinne verstanden, vielmehr im Sinne von Baugruppe, Bauabschnitt) und eine kleinere Gebäudegruppe mit insgesamt 317 Wohnungen der Baugemeinschaft Grüzefeld, 53 Altenwohnungen, Lebensmittelladen, gewerblichen Räumen und Nebenanlagen. In zwei Unterterrain-Garagen sind ca. 200 Autoabstellplätze vorgesehen.

Konstruktion

Die Realisierung des geplanten Projektes in konventioneller Bauweise wäre, abgesehen von deren anachronistischen Zügen und finanziellen Nachteilen, auch technisch auf etliche Schwierigkeiten gestoßen. Die starke Staffelung der Baublocks in horizontaler wie vertikaler Richtung hätte ein gehöriges Mehr an teurem Fassadenmauerwerk und umständlichen Gerüsten erbracht.

Es wurde daher nach einer raumsparenden, dünnen, jedoch hochisolierenden und, zur raschen und einfachen Montage, möglichst großformatigen Außenwand gesucht. Die gewählte Schwerbeton-Elementbauweise über konventionell errichtetem Untergeschoß weist diese Vorteile auf.

Die fortgeschrittene Entwicklung auf dem Gebiet der Bau- und Transportmaschinen kam dem Wunsch nach großformatigen Elementen entgegen und ermöglichte Herstellung und Transport von Bauteilen bis zum Gewicht von 9,5 Tonnen. So versetzte man in sogenannter trockener Montage: alle Zimmerdecken als ein Element, fugenfrei bis 22 m²:

alle Zimmerwände als ein Element, fugenfrei auf Geschoßhöhe:

Fassadenelemente auf Wohnungsbreite und Geschoßhöhe, z. B. 6,00 m lang und 2,60 m hoch:

Bad/WC-Flement als Kastenelement.

Mit Hilfe dieses Bausystems konnten auch die technisch wie architektonisch stets kritischen Fugen weitgehend vermieden werden.

Der kurze Montagerhythmus und die hohe Maßgenauigkeit weniger großer Elemente, die Witterungsunempfindlichkeit des Materials seien nur nebenbei erwähnt.

Schon in die Rohbauelemente wurden die elektrischen Installationen, verzinkte Stahltürzargen usw. eingebaut.

Die erreichte Kostenverringerung im Rohbau kam einem höheren Komfort im Ausbau zugute:

Glaserarbeit ausschließlich in Verbundglas; eingebaute Schränke, innen und außen mit Kunststoffplatten abgedeckt;

einbrennlackierte Leichtmetalljalousien; vollinstallierte, mechanisch ventilierte Kü-

Bodenbeläge aus Kunststoff mit wirksamer Trittschalldämmung aus Kork; vollautomatische Wäsche- und Trockenappa-

Wirtschaftlichkeit

Um eine frühzeitige Entscheidung zur Präfabrikation oder zur konventionellen Bauweise treffen zu können, wurde auf Grund einer allgemeinen Vorausschreibung über Konstruktionsvarianten eine genaue Preisanalyse über die Hauptelemente des Rohbaus aufgestellt: Außenwandkonstruktionen, innere Trag- und Scheidewände, Deckenplatten. Dieser Vergleich der Rohbaukosten zeigte, daß für diesen speziellen Fall eine gleichwertige konventionelle Bauweise ca. 18 Prozent teurer geworden wäre als die oben beschriebene Schwerbeton-Elementbauweise. Bezogen auf die gesamten Gebäudekosten wird in diesem Fall mit einer Kostendifferenz von 5 bis 8 Prozent zugunsten der Vorfabrikation gerechnet. Diese Differenz wiegt schwer, wenn man die veranschlagte Summe von 28 Millionen Franken für die ganze Überbauung Grüzefeld berücksichtigt.

Als weiterer wirtschaftlicher Vorteil muß der Raumgewinn durch dünnere Außenwände erwähnt werden, der bei gleichbleibender Ausnutzung des Baulandes rund 8 bis 10 Wohnungen ergab.

Die Bauzeitverkürzung ist eines der Hauptargumente für das industrialisierte Bauen und spielt im Wohnungsbau eine entscheidende Rolle

Die Bautermine hören sich, zumal im Vergleich mit den langen Jahren, die für Verhandlungen mit Grundeigentümern, Baubehörden und Finanzierungsstellen gebraucht wurden, phantastisch an:


Baubeginn (Aushub): 5. März 1965 Montagebeginn Block I: 4. August 1965 Montage fertig Block I: 25. November 1965 Bezug erste Wohnung Block I: 3. Januar 1966 Bezug letzte Wohnung Block I: 1. April 1966 Montagebeginn Block II: 8. Dezember 1965 Montage fertig Block II: 4. Mai 1966 Bezug erste Wohnung Block II: 15. Juni 1966 Bezug letzte Wohnung Block II: 15. September 1966

Montagebeginn Block IV: 15 Mai 1966 Fertigstellung der ganzen Überbauung: Ende 1967

Wohnungstypen

Die insgesamt 370 Wohnungen verteilen sich auf Altenwohnungen mit 1 bis 2 Zimmern, 2- bis $5^{1/2}$ -Zimmer-Wohnungen und $6^{1/2}$ -Zimmer-Maisonette-Wohnungen. Durch spiegelbildliche Anordnung, durch Spezialtypen an Blockübergängen und Blockenden entstanden 36 verschiedene Wohnungstypen. Charakteristisch für die meisten Wohnungsgrundrisse ist die weitgehend gleichbleibende Anordnung der Raumgruppe Wohnraum - Eßplatz - Balkon - Küche - Bad/WC, die durch Anfügen von ein bis vier Schlafzimmern zu Wohnungen verschiedener Größe ergänzt wird.

Ausgangspunkt für die zahlreichen Kombinationen war die prinzipielle Gruppierung einer $3^{1}/_{2}$ - und $4^{1}/_{2}$ -Zimmer-Wohnung an einem Treppenhaus, in der Horizontalen seitlich gestaffelt, in der Vertikalen halbgeschossig versetzt. Größere Wohnungen entstehen an den Blockenden, Kleinwohnungen in den Laubengangtrakten. Grundsätzlich sind die Wohnräume nach Süden orientiert, die Schlafräume nach Osten bzw. Westen, je nach Aufstellung des Wohnblocks. Wohnraum, Eßplatz, Küche und Loggia werden zu einer räumlich differenzierten Einheit zusammengefaßt, bilden einen gegliederten, großzügig wirkenden Einraum. Der Grundrißtyp ist knapp in seinen Gesamtabmessungen, enthält jedoch infolge minimaler Verkehrsflächen relativ große Räume.







1 Modellansicht von Süden. Maquette vue du sud. Model viewed from south.

2 Modellansicht von Südwesten. Maquette vue du sud-ouest. Model viewed from southwest.

3 Modellansicht von oben. Maquette vue du en haut. Model viewed from above.

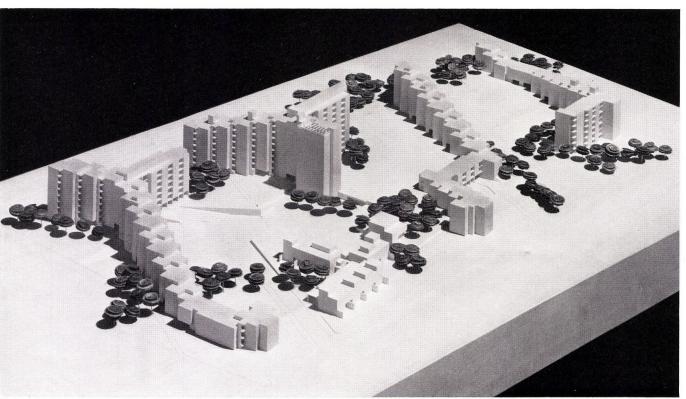

3

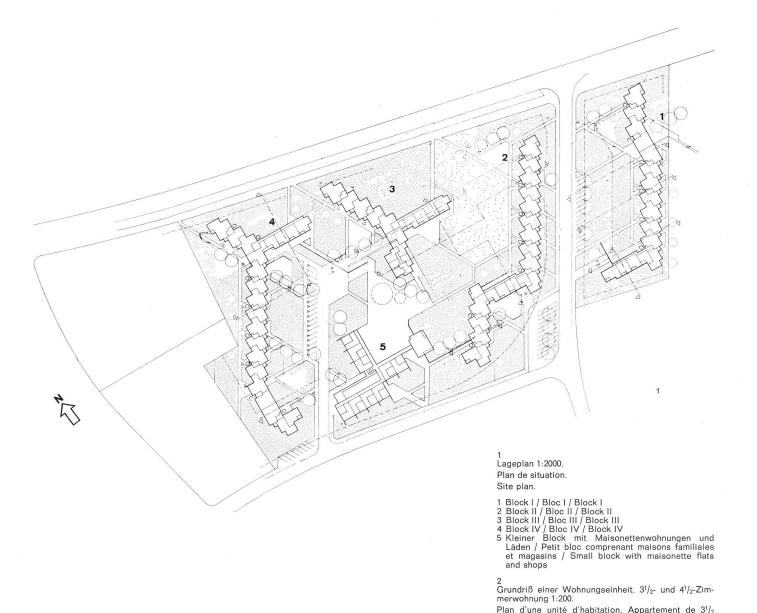

6 5 2 3

2

3 Grundriß Wohngeschoß Block IV, 1:500. Plan des appartements du bloc IV. Plan of apartments of block IV.

1 31/₂-Zimmer-Wohnung / Appartement de trois pièces 1/₂ / 31/₂-room flat 2 41/₂-Zimmer-Wohnung / Appartement de 41/₂ pièces /

Plan d'une unité d'habitation. Appartement de $3^{1}/_{2}$ Plan of a residence unit. $3^{1}/_{2}$ - and $4^{1}/_{2}$ -room flat.


Wohnraum / Living / Living-room
 Eßplatz / Coin-repas / Dining-nook
 Balkon / Balcon / Balcony
 Küche / Cuisine / Kitchen
 Bad und WC / Bain et WC / Bath and WC
 Schlafraum / Chambres à coucher / Bedroom


4¹/₂-room flat 3 5¹/₂-Zimmer-Wohnung / Appartement de 5¹/₂ pièces /


3 b¹/₂-Zimmer-Wohnung / Appartement de 5¹/₂ pièces / 5¹/₂-room flat
4 -Zimmer-Doppelgeschoßwohnung / Appartement duplex de 4 pièces / 4-room duplex flat
5 2-Zimmer-Wohnung / Appartement de 2 pièces / 2-room flat
6 3-Zimmer-Wohnung / Appartement de 3 pièces / 3-room flat

Grundriß Sockelgeschoß Block IV 1:500. Plan du rez-de-chaussée surélevé du bloc IV. Plan of ground floor of Block IV.

1 Eingang / Entrée / Entrance 2 Abstellräume / Débarras / Storage 3 Kinderwagen / Poussettes / Prams 4 Waschküche / Buanderie / Laundry 5 Trockenraum / Etendage / Drying-room

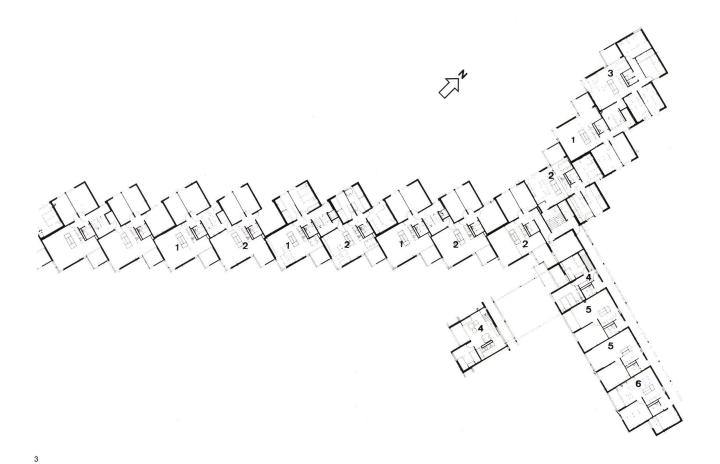

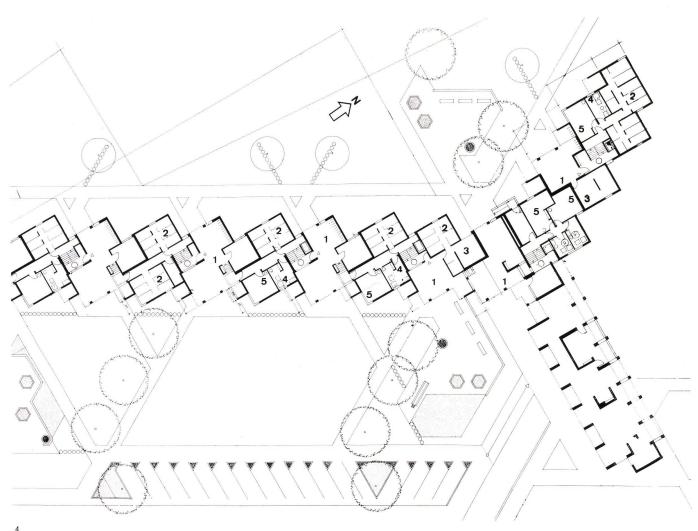

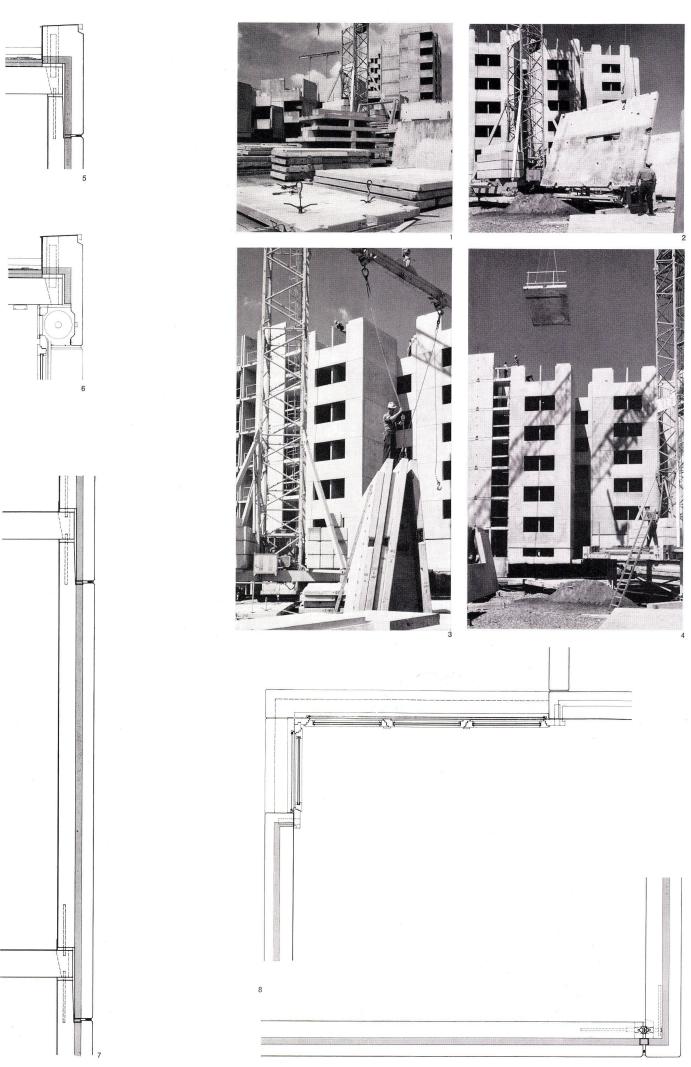

1-4 Montageaufnahmen. Prises de vue pendant le montage. Views taken during assembly.

Block IV in der Montage, im Vordergrund Lager von Deckenplatten.

Bloc IV pendant le montage, au premier plan dépôt de plaques de revêtement.

Block IV during assembly, in foreground, coping panels.

Kippen einer Deckplatte in Horizontalstellung zum Versetzen am Bau.

Décrochage d'une plaque de recouvrement pour la changer de place.

Manoeuvring of a panel into horizontal position, for moving.

3
Eine Deckenplatte wird angehängt zum Transport auf den Horizontal-Kipptisch.
Une plaque de recouvrement est suspendue pour être transportée sur une table culbutante horizontale. A panel is suspended for transport on a horizontal pivoting board.

4 Horizontaltransport einer Deckenplatte. Transport horizontal d'une plaque de recouvrement. Horizontal transport of a panel.

5-8 Fassadenschnitte 1:20. Coupes de la façade. Face sections.

5 Vertikalschnitt durch Dachgesims. Coupe verticale au travers du cordon. Vertical section of roofing cornice.

vertikalschnitt durch Dachgesims mit Rolladen. Coupe verticale au travers du cordon avec jalousies. Vertical section of roofing cornice with roll-shutter.

Vertikalschnitt durch eine geschlossene Wand. Coupe verticale au travers d'un mur fermé. Vertical section of closed wall.


8 Horizontalschnitt durch Ecklösung mit Fenster und Ecklösung mit geschlossener Wand. Coupe horizontale au travers d'un coinde mur avec

fenêtre en équerre


Horizontal section of corner with window and corner with closed wall.

9 Block II von Nordosten. Le bloc II vu du nord-est. Block II from northeast.


10 Block I von Süden. Bloc I vu du sud. Block I from south.

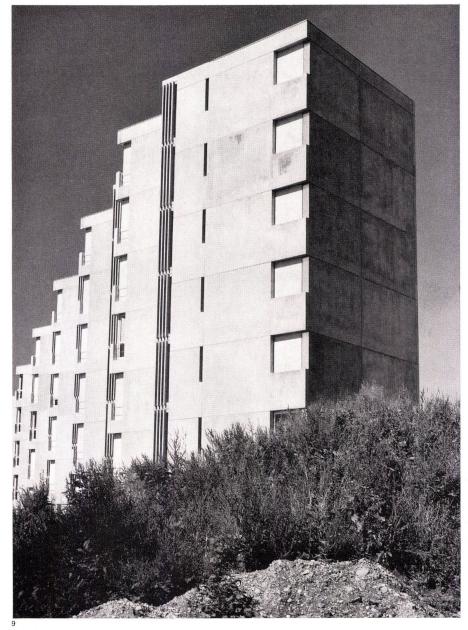





Wohnraum. Habitat. Living tract.

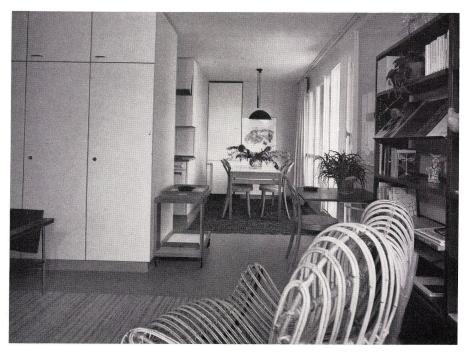

Eßplatz, links anschließend Küche und Schrankwand, rechts Ausgang zum Balkon.
Coin-repas, à gauche cuisine adjaçante et armoire murale, à droite sortie sur le balcon.
Dining-nook, left, adjoining kitchen and cupboards, right, exit to balcony.



 $\mathsf{E}\mathsf{B}\mathsf{platz},$ Küche und Wohnraum als gegliederter Einraum.

Coin-repas, cuisine et séjour, compris en une seule pièce articulée.

Dining-nook, kitchen and living room, designed as one single articulated area.
