

Zeitschrift: IABSE structures = Constructions AIPC = IVBH Bauwerke
Band: 8 (1984)
Heft: C-30: Industrial cranes

Artikel: Portique automoteur pour la réfection d'une piste d'aéroport (Suisse)
Autor: Waldburger, Max
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-18832>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



7. Portique automoteur pour la réfection d'une piste d'aéroport (Suisse)

Maître de l'œuvre: Aéroport de Genève
Entreprise: Consortium SA Conrad Zschokke – Induni SA

Introduction

Dès les années 1970, la piste unique de l'aéroport de Genève présentait des signes évidents de fatigue. La piste et sa fondation étaient arrivées à leur limite d'âge et de portance. Une réfection systématique devait être entreprise, sans interruption du trafic aérien. Il fallait donc opérer durant les pauses quotidiennes entre 24.00 h et 05.00 h.

Après avoir étudié différentes solutions, il fut décidé de rénover la piste au moyen d'éléments de dalle préfabriqués qui seuls répondaient aux conditions d'exécution et de qualité.

Procédé

Le travail est exécuté par cinq ateliers indépendants les uns des autres.

- 1) L'ancienne dalle (épaisseur 30 à 45 cm) est découpée en éléments de $7 \times 12 \text{ m}^2$ au moyen d'une scie lourde à disque diamanté de 1.60 m de diamètre qui permet une précision de coupe de $\pm 5 \text{ mm}$.
- 2) Une soixantaine d'ancrages sont scellés dans la dalle, au-dessous de la surface de roulement. Ils permettront d'enlever d'un coup un élément de 84 m^2 , sans que se disloquent ses parties fissurées ou séparées par un joint.
- 3) L'atelier qui exécute la réfection de 84 m^2 de piste en 3 heures et 30 minutes dispose d'un important matériel:
 - un portique automoteur sur pneus
 - un pelle hydraulique 1 m^3 sur pneus
 - truckmixer et camions, multibennes
 - remorques pour l'éclairage et accessoires
 - tour à béton et malaxeur de coulis sur la place d'installation fixe.

Le travail se déroule de la façon suivante:

- à l'aide d'un cadre de levage muni de 60 élingues à ressort, le portique soulève l'ancien élément et l'écarte du chantier;
- 70 m^3 d'ancienne infrastructure et de terrain en place sont excavés, le fond de fouille soigneusement damé et réglé;
- l'ancien élément est posé à bain de mortier au fond de fouille à l'aide du portique. Cette réutilisation renforce l'infrastructure nouvelle tout en évitant les frais d'évacuation;
- 10 m^3 de grave concassée, stabilisée au ciment, sont mis en place, compactés et réglés avec grande précision. Ils forment la couche de transition;

- la dalle préfabriquée, suspendue à son cadre de pose, est amenée par le portique et descendue dans la fouille.
- Dès que le cadre de pose a pris appui sur la piste existante par l'intermédiaire de ses 4 vérins hydrauliques, le portique est décroché et retiré. Le calage fin de l'élément se fait automatiquement au moyen des vérins. Le vide de 4 cm d'épaisseur laissé entre la dalle et la couche de transition est alors rempli avec un coulis au ciment qui après 1 heure 30 minutes aura suffisamment durci pour permettre l'ouverture de la piste au trafic. Ce coulis spécial a été mis au point par le laboratoire de la SA Conrad Zschokke. L'injection s'effectue par gravité, à l'aide d'un long entonnoir qui répartit le coulis sur la longueur de la dalle.
- Peu avant la remise en service de la piste, celle-ci est libérée de tout matériel et nettoyée soigneusement.

Grâce à la combinaison judicieuse de la rigidité du cadre de pose, de la viscosité du coulis, de la précision du système de réglage automatique et à l'expérience de l'équipe de pose, le problème de la poussée d'Archimède – qui peut soulever la dalle pendant l'injection – est parfaitement maîtrisé.

- 4) Le jointolement des dalles se fait au mortier synthétique. La partie supérieure des joints est remplie avec un produit bitumineux.
- 5) La préfabrication s'exécute à proximité de la piste sur un tarmac de l'aéroport. Les dalles sont bétonnées les unes sur les autres en piles de 4 à 5 éléments. Huit barres d'ancrage pour l'accrochage au cadre de transport et de pose sont incorporées à chaque élément.



Fig. 1 Sciage de la piste existante en éléments de $7 \times 12 \text{ m}$, profondeur de coupe maximum 50 cm

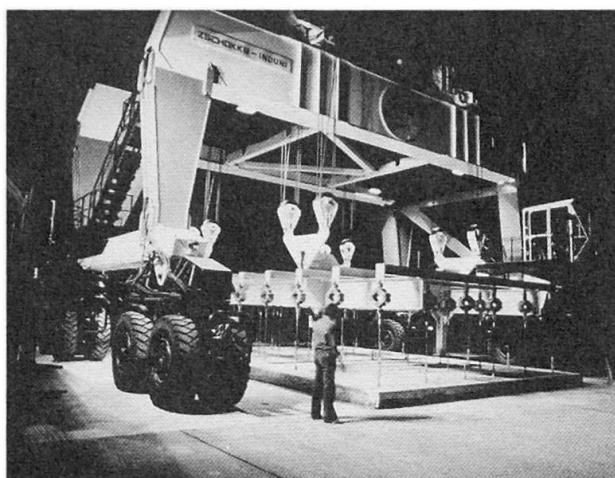


Fig. 2 Enlèvement de l'élément de piste pré-découpé

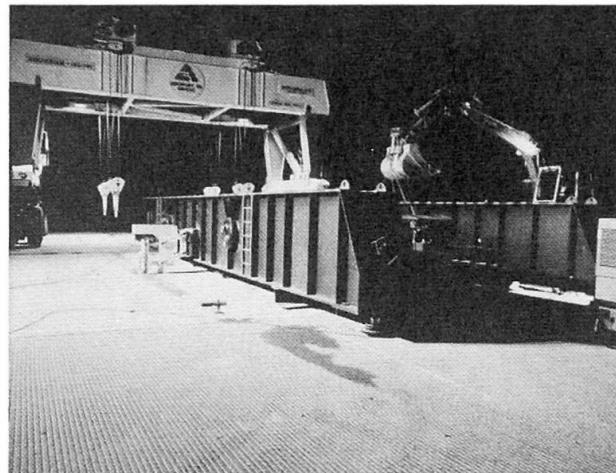


Fig. 5 Réglage de la dalle à l'aide des 4 vérins du cadre de pose

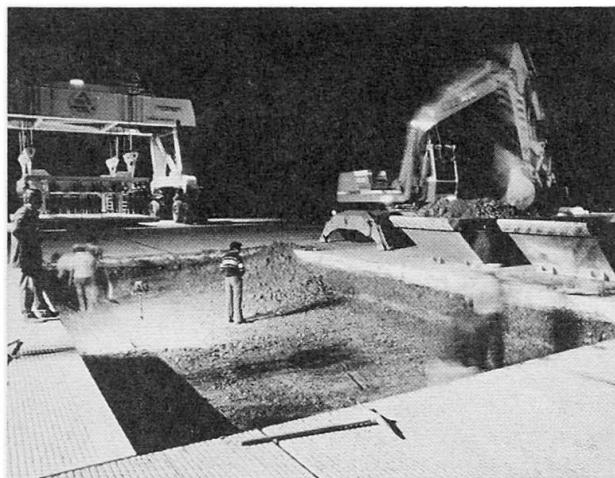


Fig. 3 Excavation de l'infrastructure et du terrain en place

Portique automoteur

Le portique automoteur est le maître-ingenier de ce chantier. Il a été construit par l'Entreprise Rovera à Turin. Ses caractéristiques principales sont les suivantes:

– Charge utile maximum	1800 KN
– Course des crochets coordonnés	6.0 m
– nombre de roues	16
– Ecartement axe – voie	12.0 m
– Rayon de braquage	20 m
– Vitesse en charge	3,5 km/h

Il est équipé d'un double système de moteurs et circuits hydrauliques qui peuvent se relayer en cas de défaillance de l'un d'eux.

A ce jour, il a permis la rénovation de plus de 20000 m² de piste.

(Max Waldburger)

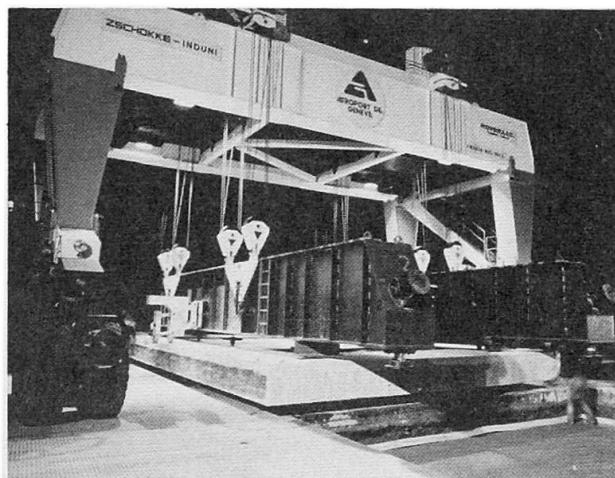


Fig. 4 Transport et mise en place des dalles préfabriquées
