

Baukostenüberwachung mittels Personal Computer: Erfahrungen aus dem Projektmanagement für ein Geschäfts-, Wohn- und Garagenobjekt

Autor(en): **Thönig, Werner / Schwaiger, Gerhard / Milborn, Georg**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **102 (1984)**

Heft 39

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-75533>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Baukostenüberwachung mittels Personal Computer

Erfahrungen aus dem Projektmanagement für ein Geschäfts-, Wohn- und Garagenobjekt

Von Werner Thönig, Innsbruck, Gerhard Schwaiger, Mutters, und Georg Milborn, Innsbruck

Die neue Computer-Generation der Personal Computer (PC) hat bereits in fast allen Bereichen der Wirtschaft und Technik Eingang gefunden. Der Einsatz eines PC eignet sich auch zur Baukostenüberwachung von Bauvorhaben aller Grössenordnungen.

Jeder Bauherr hat anlässlich der Realisierung seines Bauvorhabens vom Beginn der Planungen bis zur Fertigstellung eine Reihe von Problemen zu bewältigen. Die Vielfalt der rechtlichen, organisatorischen und technischen Überlegungen wird von der wirtschaftlich finanziellen Seite des Projektes bestimmt. Der verantwortungsbewusste Bauherr wird durch ständige Überwachung der Baukosten deren Entwicklung beobachten, um ungünstige Entwicklungen bereits im Ansatz zu erkennen und ihnen durch verschiedene Steuerungsmassnahmen entgegenzuwirken.

Baukostenüberwachung mittels PC - warum?

Wer einmal mit der Abwicklung eines Bauvorhabens befasst war, weiss über die mühsamen Tätigkeiten zu berichten, die mit dem Zusammenstellen von Baukostenübersichten, Schlussabrechnungen und dergleichen verbunden sind. Aufgrund des enormen Arbeitsaufwandes, welcher mit der Erstellung von Baukostenübersichten verbunden ist, ist eine Aussage über die tatsächlichen Baukosten oft erst ein halbes Jahr nach der Baufertigstellung oder gar später möglich, geschweige denn ein detaillierter Überblick über die Baukosten während der Bauphase.

Hierin liegt der Vorteil einer Baukostenüberwachung mittels EDV, indem vom Beginn bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens ein genauer Überblick der Kosten ermöglicht wird.

Die praktische Bedeutung einer Baukostenkontrolle mittels PC liegt vor allem

- im relativ geringen Investitionsaufwand für die Anschaffung eines PC,
- im direkten Zugriff zum Datenmaterial zu jedem Zeitpunkt,
- in der einfachen Programmierung und
- in anderweitigen Einsatzmöglichkeiten (Textsystem, Finanzbuchhaltung oder technische Anwendungen).

Funktionen der Baukostenkontrolle

Die Informationsfunktion, die Kontrollfunktion und die Steuerungsfunktion

greifen Hand in Hand ineinander über und haben den folgenden Inhalt.

Informationsfunktion

Um die Kontrolle und Steuerung der Baukosten wirksam wahrzunehmen, bedarf es sogenannter Basis- oder Ausgangsinformationen. Bei diesen Informationen handelt es sich aufbauend um

- eine detaillierte Kostenschätzung des Architekten und sämtlicher Sonderprojektanten, für alle am Bau beschäftigten Professionisten,
- Einholung von Angeboten,
- Auftragsvergabebesummen,
- Informationen über den Zahlungsfluss, d.h. An-, Teil- und Schlusszahlungen,
- Termine - Bauzeitplan und
- sonstige Faktoren wie Baukostenerhöhungen durch Materialpreis und Lohnerhöhungen.

Dieses Datengerüst ist nun zu ordnen und für den Einsatz als Kontroll- und Steuerungsinstrument aufzubereiten. Dabei ist relativ rasch erkennbar, dass eine derartige Fülle von Datenmaterial, die auf den Bauherrn einströmt, zwar von Hand noch bearbeitet werden kann, jedoch nur unter einem äusserst grossen Zeitaufwand. Bei Verwendung eines Personal Computers ist dies jedoch durchaus zu bewältigen.

Kontrollfunktion

Das Problem einer projektgemässen Baukostenkontrolle liegt darin, dass zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung in der Regel bestenfalls erst Schätzungen des Architekten vorliegen.

Im Zuge der Baurealisierung ist das Da-

tenmaterial temporär gestreut, und zwar von Schätzungen bis zu bereits abgerechneten Leistungen.

Das einerseits nach Positionen wie Baumeister, Haustechnik, Spengler, Glaser, Zimmerer usw. und andererseits nach der Aktualität der Informationen wie Schätzung, Angebot, Auftrag und Abrechnung gegliederte Datenmaterial kann bei entsprechender Aufbereitung in jeder Projektphase kontrolliert und überwacht werden.

Der erste Ansatz der Kontrolle liegt bereits im Vergleich zwischen der Kostenschätzung bzw. dem Budget einzelner Positionen und dem Ausschreibungsergebnis.

Eine weitere Kontrolle ergibt sich aus dem Vergleich zwischen dem Angebotsergebnis und dem Auftrag, dessen Differenz den Verhandlungserfolg des Bauherrn widerspiegelt.

Der Vergleich zwischen dem Auftrag und der Kostenschätzung bzw. dem Budget gibt bereits eine Auskunft über die Kostenüber- oder Kostenunterschreitung zum jeweiligen Zeitpunkt.

Der Überblick über geleistete Teil- und Schlusszahlungen in Abstimmung mit dem jeweiligen Baufortschritt sowie die Untersuchung der Ursachen von Kostenüber- und -unterschreitungen soll die Baukostenüberwachung in ihrer Kontrollfunktion erfüllen. Hierzu gehört auch die Hochrechnung der Auftragssumme aufgrund Preissteigerungen, Änderung von Steuersätzen (z.B. MWSt.) und dgl.

Steuerungsfunktion

Hand in Hand mit der Kontrollfunktion geht die Steuerungsfunktion. Vor allem sind hiebei jene Massnahmen zu verstehen, die der Bauherr treffen muss, wenn er seinen Budgetrahmen nicht überschreiten will. Die Möglichkeiten, die der Bauherr zur Steuerung der Baukosten hat, liefert die bis hierher beschriebene Baukostenkontrolle, indem er z.B. bei groben Abweichungen von Kostenschätzung bzw. Budget zum Angebot günstigere Varianten sucht oder Einsparungen trifft und darüberhinaus einen entsprechenden Verhandlungsdruck auf die anbietenden Firmen zwecks Preisreduktion ausübt. Hier liegt es vor allem in der Hand des Bauherrn bzw. an dessen Disziplin, die jeweils erforderlichen Massnahmen zu treffen.

Vor allem aufgrund des lückenlosen Informationsmaterials müssten dem Bauherrn Entscheidungen über Varianten, teurere oder billigere, leichter fallen. Speziell, wenn sich das Projekt in der Ausbauphase befindet und bereits ein

grosser Teil der Professionisten abgerechnet sind, ist eine derartige Baukostenkontrolle für weitere Vergabeentscheidungen sehr wertvoll.

EDV-unterstützte Baukostenüberwachung

Sehr bald nach der Einführung von EDV-Geräten in den verschiedenen Verwaltungsbereichen wurden auch Programme entwickelt, welche eine Baukostenüberwachung mittels EDV ermöglichen.

Einige davon sind z.B. das von IBM entwickelte Programm mit der Bezeichnung «PROJAX», welches auf der IBM-Anlage 4331 zum Laufen gebracht wurde. Ein anderes Programm wäre z.B. mit der Bezeichnung «ADKOS», welches auf einem Nixdorf-Computer-System 8870/1-10 läuft.

Diese Geräte und Programme der 60er und 70er Jahre waren zwar sehr leistungsfähig, wiesen aber verschiedene

Nachteile auf. Die Computer waren sehr teuer, der Einstieg war schwierig und die Programme konnten aufgrund ihrer Undurchsichtigkeit nur von Spezialisten bearbeitet werden.

Unter diesen Voraussetzungen war für den Baumanager ein schneller Überblick über die Baukosten, sozusagen auf Knopfdruck, nicht leicht möglich.

Standardisierungsbestrebungen

In Österreich werden zurzeit die Funktionen des PC im Kreislauf von Ausschreibung, Bieter-Kalkulation, Vergabeberechnung und Endabrechnung sowie der Bildschirm im Baubüro oder als Planzeichner ausprobiert und getestet.

Im «Computerlatein» finden sich mittlerweile Abkürzungen wie:

- AGöST - Arbeitsgemeinschaft österr. Standardleistungsbuch - mit der Zielsetzung, eine einheitliche Beschreibung von Bauleistungen zu erstellen, was mit dem

- öSTLB bzw. LB-H - österr. Standard-Leistungsbuch - bzw. mit der «standardisierten Leistungsbeschreibung für den Hochbau» erreicht wurde;
- FOPEK - Forschungsprogramm für Kalkulation mit elektronischer Datenverarbeitung;
- AVA - Automatisierte Anwendung für Ausschreibung - Vergabe - Abrechnung;
- öREB - österreichische Richtlinien für elektronische Bauabrechnung;
- F750 - Benutzerhandbuch für öSTLB, LB-H und AVA.

In der Planung und Ausführung geht der Trend in die Richtung, dass einmal im Zuge rückläufiger Baukonjunktur die Vorteile einer genaueren Kalkulation durch standardisierte Leistungsverzeichnisse und deren automatischer Einsatz erkannt werden.

Die Einsteiger rekrutieren sich einerseits aus grossen Firmen, die ihren Verwaltungsbereich bereits EDV-mässig organisiert haben und andererseits aus Kleinbüros, welche die neue Technologie als Mittel einsetzen, um nicht ex-

Tabelle 1. Ausdruck des Programmschemas

NUMMER 5 (Stand 31.03.1984) DATUM 26.04.1984		BAUKOSTENKONTROLLE								T L S B A U M A N A G E M E N T ARCH. DI. W. THÖNIG + ING. DR. G. SCHWAIGER			
WERTE IN DES 1000.--													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
POSITIONEN	SCHAETZUNG	ANGEBOT	AUFTRAG	VERHND. ERG. (C - D)	RESERVE (B - D)	ZAHLUNGEN	RECHNUNG	OFFENE ZHLG. (D - G)	MUTMASSL. ABRECH. (HOCHRECHNUNG)	+/- AUFTRAG (D - J)	+/- BUDGET (B - J)		
SUMME GRUND	29,406	29,406	29,406	0	0	29,406	29,406	0	29,406	0	0		
SUMME BAUKOSTEN	135,700	50,683	47,381	3,301	88,319	21,927	7,424	25,634	133,470	-977	2,230		
SUMME AUFSCHLIESS.	4,933	0	130	-130	4,803	137	86	-51	4,799	44	134		
SUMME BAUNEKENKOST.	1,328	1,673	1,673	0	-346	1,673	1,674	1	1,674	-1	-347		
SUMME HONORARE	15,625	19,523	16,726	2,797	-1,101	7,694	6,899	9,294	17,188	-200	-1,564		
SUMME EINRICHTUNG	14,351	0	0	0	14,351	0	0	0	14,638	0	-287		
GESAMT OHNE GRUND	171,936	71,879	65,910	5,969	106,026	31,431	16,084	34,879	171,770	-1,135	166		
GESAMT MIT GRUND	201,343	101,285	95,316	5,969	106,026	60,838	45,490	34,879	201,176	-1,135	166		

Inhalt der einzelnen Spalten:

- A Sämtliche Positionen, die der Programmierer nach Belieben untergliedern kann
- B Kostenschätzung oder Budget des Bauvorhabens je Position
- C Werte der einzelnen Angebote je Position
- D Auftragssummen
- E Verhandlungsergebnis, inwieweit der Auftrag über oder unter dem Angebot liegt.
- F Mittel, die dem Bauherrn für die noch nicht vergebenen Aufträge noch zur Verfügung stehen. Diese Information ergibt die Differenz zwischen Budget und Auftrag.
- G Zahlungen positionsweise
- H Positionen, die tatsächlich abgerechnet sind.
- I Zahlungen, die noch zu leisten sind - Differenz zwischen den bereits vergebenen Leistungen und Zahlungen.
- J Mutmassliche Abrechnung, nimmt jeweils den aktuellsten Wert von den Spalten B bis D auf und kann darüber hinaus noch durch verschiedene Werte, wie z.B. Baukostensteigerungen, Änderungen von Mehrwertsteuersätzen, Massenänderungen und dergleichen, hochgerechnet werden, um zu jedem Zeitpunkt über die voraussichtlichen Kosten je Position zu informieren.
- K Differenz zwischen den vergebenen Aufträgen und der mutmasslichen Abrechnung, jeweils positionsweise, wodurch Über- oder Unterschreitungen unmittelbar sichtbar werden. Die so gebildeten Werte werden sodann in den einzelnen Hauptgruppen als Zwischensumme aufaddiert.
- L bringt die Informationen aus den Spalten «J» mutmassliche Abrechnung mit der Spalte «B» Budget und Kostenschätzung in Beziehung und zeigt dem Baumanager, ob sein Budget über- oder unterschritten wird.

pandieren und in neue Wirtschaftsgrößen hineinwachsen zu müssen.

Sicher kommen diese Bemühungen der Planer und Anbieter letztlich auch dem Bauherrn zugute. Ansätze zur Standardisierung für eine EDV-unterstützte Baukostenkontrolle als Steuerungsinstrument für den Bauherrn bzw. Projektleiter sind jedoch nicht bekannt.

Aus diesem Grunde haben wir selbst, unter Einsatz eines IBM-PC und Programmierung mittels Arbeitsblattprogrammes eine Baukostenkontrolle aufgebaut, die in der Folge kurz beschrieben ist.

Die Hauptschwierigkeiten lagen

- im Überzeugen des Projektleiters von der Leistungsfähigkeit der Generation der PC,
- in der Auswahl der Hardware,
- der Auswahl der Programme,
- der Umsetzung der eigenen Vorstellungen und Anforderungen auf die EDV-Anwendung,
- der geringen Unterstützung seitens Hard- und Software-Lieferanten.

Die neue Computergeneration der PC

Seit der breiten Einführung von PC hat sich in diesem Bereich vieles geändert:

- die Geräte und Programme sind billiger geworden,
- die Programmiersprachen sind bedienungsfreundlicher,
- seit 1979 gibt es die sogenannten Arbeitsblatt-Programme,
- einfache Programmherstellung - z.B. durch den Baumanager,
- hohe Anpassungsfähigkeit.

Ganz allgemein haben diese Vorteile letztlich auch dazu geführt, dass sich die PC in den letzten Jahren derart

schnell verbreitet haben und aus sämtlichen Bereichen der Wirtschaft und Technik bald nicht mehr wegzudenken sind.

Hardware, Kosten, Ausbildungsplätze und Ausbildungsaufwand

Wir haben für unsere Zwecke einen IBM-PC mit 320-KB-Hauptspeicher und 2 Diskettenlaufwerke 5,25" je 360 KB samt Farbmonitor und einen EPSON-Matrixdrucker FX180 im Einsatz. Der Investitionsaufwand belief sich auf rund öS 140 000.- samt Betriebssystem DOS 2.0 zuzüglich Software öS 8000.- (Supercalc) und WORD STAR etwa öS 14 000.- als Textsystem.

Am Gerät arbeiten zwei Personen, wobei kaum Ausbildungskosten angefallen sind; allerdings war ungefähr ein Monat zur Erlernung der Bedienung des PC samt Programmherstellung bis zum effektiven Einsatz eher unproduktiv.

Dieser Zeitaufwand in der Anlaufphase muss mindestens einkalkuliert werden, wobei der Lernprozess und die Weiterentwicklung sowie eine entsprechende Auslastung der Hard- und Software in der Folge immer leichter und rascher erfolgt.

Baukostenüberwachung - Programmierung mittels Arbeitsblattprogramme - Software

Im Jahr 1979 wurde mit dem Programm «Visicalc» das erste der «Spreadsheets» geschaffen. Weiterentwicklungen sind z.B. «Supercalc», «Multi-

plan», «Lotus 1-2-3», ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Diese Programme stellen am Bildschirm einen Ausschnitt eines Arbeitsblattes dar, welches in Zeilen und Spalten eingeteilt ist, die ihrerseits Zellen definieren, in die Zahlen, Texte oder Verknüpfungen (Formeln) geschrieben werden.

Das eigentliche Programm oder die Rechenanweisungen treten in den Hintergrund. Ein- und Ausgaberroutinen (Input-Print) werden nicht benötigt.

Die Entwicklung eines Programmes ist daher einfach und erfolgt gleich wie auf einem Blatt Papier. Besonders hervorzuheben ist die hohe Rechengeschwindigkeit und Genauigkeit.

Beispiel

Die Arbeitsweise der Baukostenüberwachung mittels PC und «Supercalc» wird im folgenden anhand eines stark vereinfachten Ausdrucks eines Programmschemas erläutert. Die Tabelle¹ stellt das Arbeitsblatt dar, welches Zelle für Zelle sowohl für einzelne Daten als auch mittels Formeln belegt wird.

In der Tabelle sind lediglich Hauptpositionen aufgezeigt, die Zwischensummen darstellen. Diese Hauptpositionen sind sinnvollerweise in eine Fülle von Unterpositionen zu gliedern, um einen möglichst detaillierten Überblick zu erhalten.

Selbstverständlich soll unter der Tabelle eine Zeile mit einer Gesamtsumme aufscheinen, womit auf einen Blick die Gesamtkostensituation erfasst werden kann.

So einfach, wie sich die Tabelle darstellt, so einfach ist im Grunde genommen auch die Programmierung mittels

Bild 1. Das im Beispiel beschriebene Bauvorhaben


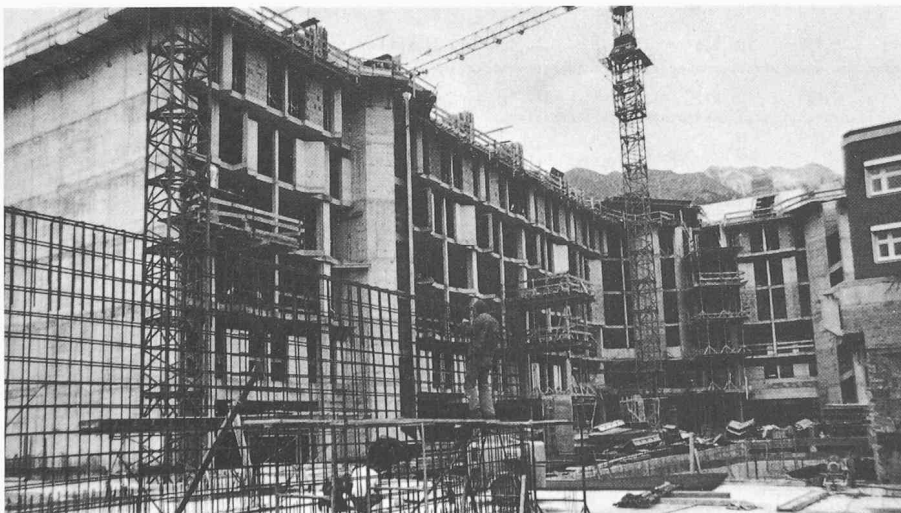


Bild 2. Personal Computer zur Baukostenüberwachung

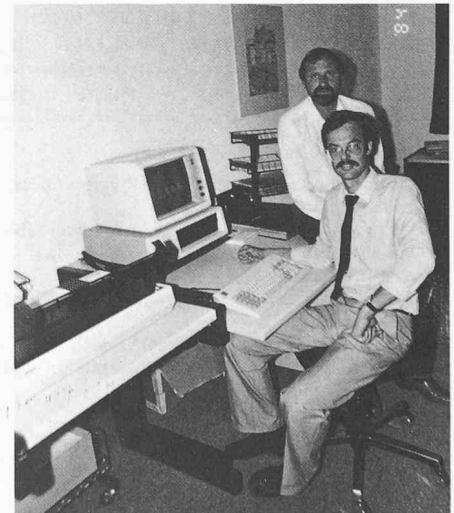

Arbeitsblattprogramm. In beliebigen Zeitabständen, z.B. wöchentlich, werden Daten ergänzt, geändert oder neu eingefügt. Die weitere Rechenarbeit übernimmt der PC. Auf Knopfdruck verfügt der Baumanager somit über einen Gesamtüberblick der Kosten mit sämtlichen Zwischensummen, Querrechnungen, Vergleichen, Über- und Unterschreitungen.

Als besonders vorteilhaft hat sich der Farbmonitor herausgestellt, welcher Eingabedaten weiss auf einem wählbaren Farbhintergrund darstellt und z.B. Zwischensummen gelb und negative Werte wie Kostenüberschreitungen rot. So können kritische Werte nicht übersehen werden, und sämtliche Daten sind äusserst übersichtlich am Bildschirm ablesbar.

Selbstverständlich ist es zweckmässig, dem eigentlichen Rechner samt Bildschirm auch einen Drucker anzuhängen, um die Informationen nicht nur am Bildschirm, sondern auch im Ausdruck ablesen zu können.

Mit diesen Instrumenten - Bildschirm und Ausdruck - ist für den Baumanager das schwierige Thema der Baukostenüberwachung leicht zu beherrschen und durchzuführen.

Schlussbemerkung

Die beschriebene Arbeitsmethode stellt nicht nur ein theoretisches Modell dar, sondern wird derzeit für das Grossbauvorhaben eines Bank-, Geschäfts-,

Büro-, Wohn- und Garagenobjektes mit einem Kostenrahmen von rund öS 300 Mio. angewendet.

Wir stehen heute mitten in der Bauphase und sind aufgrund der beschriebenen Baukostenkontrolle in der Lage, vom Beginn des Projektes bis zur Fertigstellung dem Bauherrn jede Information über den jeweils aktuellen Kostenstand zu geben. Es kann zu jedem Zeitpunkt noch rechtzeitig eine Steuerung der Kosten vorgenommen werden, und wir sind zuversichtlich, dieses Projekt im vorgesehenen Kostenrahmen erfolgreich abschliessen zu können.

Adressen der Verfasser: Architekt Dipl.-Ing. Werner Thönig, Anton-Rauch-Strasse 13a, A-6020 Innsbruck; Ing. Dr. Gerhard Schwaiger, Birchfeld 8,

Optimierung des Mastabstandes bei Freileitungen

Von Erwin Amport und Peter Amport, Luzern

Der Mastabstand von Freileitungen wurde bisher mit aufwendigen Methoden (Verfahren) optimiert. Die beiden Autoren haben eine Lösung auf analytischem Weg gefunden. Er führt zu verblüffend einfachen Formeln, die sich auf dem Taschenrechner programmieren lassen. Wir publizieren die Problemlösung, da sie bisher nur im Jahresbericht 1981/82 des Zentralschweizerischen Technikums Luzern bekanntgemacht worden ist.

Einleitung

Bei der nun folgenden *Optimierung* werden die Materialkosten K in Abhängigkeit des Horizontalzuges H dargestellt. Das mag auf den ersten Blick überraschen, erwartet man doch eher eine Darstellung von K in Abhängigkeit des Mastabstandes oder der Masthöhe. Dies wurde zuerst auch versucht, doch ohne Erfolg! Der mathematische Eliminationsprozess hat uns, zusammen mit physikalischen Überlegungen, den Horizontalzug H als freie Variable aufgezwungen. Man kann natürlich K in Abhängigkeit von mehreren Variablen darstellen. Dadurch wird die Bestimmung des optimalen H -Wertes aber viel komplizierter und schwieriger, da die Existenz eines Minimums für K nicht mehr durch blosses Aufzeichnen der Kostenfunktion bewiesen werden kann. An die Stelle der anschaulich graphischen Methode treten dann Untersuchungen mit Hilfe der partiellen Ableitungen.

Die übrigen in der Kostenfunktion (7) auftretenden Parameter gehen als Konstanten in die Rechnung ein. Dies betrifft insbesondere auch die maximal zulässige Seilkraft S , die vom Ingenieur durch die Wahl des Seiles bestimmt wird. Diese maximale Seilkraft wird bei minimalem Durchhang des Seiles (im Winter) erreicht. Für die Konstante m muss daher der grösstmögliche minimale Seilabstand von der Erde eingesetzt

werden. Man wird also zum gesetzlich vorgeschriebenen Minimalabstand m_0 einen Winterzuschlag addieren. Da dieser Zuschlag das Ergebnis der Optimierung nicht stark beeinflusst, dürfte er im allgemeinen als Erfahrungswert in die Rechnung eingehen. Zur genaueren Bestimmung des Abstandes m kann man das folgende «Iterationsverfahren» verwenden:

Optimierung mit einem Erfahrungswert für m durchführen $\rightarrow l$ und f . Aus l und f Seillänge b zwischen zwei Aufhängepunkten bestimmen und daraus den kleinstmöglichen Abstand m_1 (Sommerabstand) berechnen. Differenz $m_0 - m_1$ bilden und zu m addieren: $m_2 = m + (m_0 - m_1)$. Optimierung mit dem neuen Wert m_2 durchführen.

Ein anderes Beispiel zur Bestimmung von m wird in [1] beschrieben.

Bevor wir nun in den Eliminationsprozess einsteigen, noch einige Worte zu *zwei Konstanten* und deren physikalischem Inhalt: Bei Überspannung einer bestimmten horizontalen Distanz bleibt die *Länge des Seiles*, ungeachtet der Art und Weise, wie die Masten gesetzt werden, praktisch konstant. Dies ist eine Erfahrungstatsache, lässt sich aber auch mathematisch leicht nachprüfen. Wir haben deshalb die Seilkosten (pro horizontale Längeneinheit) als Konstante C_2 in die Rechnung eingeführt.

Eine weitere Bemerkung betrifft das *Mastgewicht*. Unter der Voraussetzung, dass für eine bestimmte Überspannung Masten verschiedener Höhe geometrisch ähnlich sind, ist das Verhältnis vom «äusseren» Mastvolumen (Pyramide) zum effektiven Mastvolumen konstant. Das Mastgewicht ist somit dem Pyramidenvolumen direkt proportional, was mit der Konstanten C_3 ausgedrückt wird.

Damit sollte der Weg zur Berechnung geebnet sein. Lassen wir also die Mathematik sprechen.

In der Berechnung werden folgende *Abkürzungen* verwendet:

K	=	Materialkosten pro horizontale Längeneinheit (für Masten und Seil)
G	=	Gewicht eines Mastes
M	=	Maximal zulässiges Biegemoment auf Mastbasis
W	=	Widerstandsmoment des Mastquerschnitts an der Basis
