

Neues EDV-Planungsprogramm auf Balkendiagramm-Basis

Autor(en): **Staub, Karl / Landolt, Walter / Lang, Robert**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **100 (1982)**

Heft 35

PDF erstellt am: **25.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-74848>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Neues EDV-Planungsprogramm auf Balkendiagramm-Basis

Von Karl Staub, Walter Landolt und Robert Lang, Baden

Vielfältige Erfahrungen im Projektmanagement von diversen Kraftwerksprojekten und eine starke Entwicklung der heutigen Planungshilfsmittel hin zu einfachen Resultatdarstellungen sowie die sprunghafte Entwicklung von leistungsfähigen Kleincomputern gaben den Anstoss, ein neues Planungsprogramm zu entwickeln. Dieses Programm BALKPLOT wurde auf der Basis des bewährten Balkendiagrammes aufgebaut und umfasst alle wesentlichen Planungsbereiche des Projektmanagements, wie Terminplanung, Einsatzmittelplanung, Fortschrittsüberwachung und Kritische Pfad-Analyse. Der folgende Beitrag soll die Idee der computerisierten Balkendiagramm-Technik aufzeigen und die mit BALKPLOT bis heute gemachten Erfahrungen vermitteln.

Einseitige Entwicklung der Planungshilfsmittel

Mit der Einführung der *Netzplantechnik* in den 60er Jahren war man überzeugt, damit das ideale Hilfsmittel für die Ablaufplanung aller technischen Anlageprojekte gefunden zu haben. Nachdem die Anwendung dieser neuen Planungstechnik bei verschiedenen Projekten bestechende Anfangserfolge brachte, wurden auf breiter Basis von verschiedenen EDV-Unternehmen umfangreiche *Netzplanprogramme* entwickelt, um diese Technik leichter, schneller und wirkungsvoller einsetzen zu können. Die gewaltigen Fortschritte der Netzplantechnik führten schliesslich soweit, dass man vielerorts glaubte, mit der Netzplantechnik als *Planungsinstrument* sei der *Projekterfolg* zum vornherein sichergestellt.

Daneben war die Weiterentwicklung anderer Planungstechniken, wie z. B. *Balkendiagramm* oder *Liniendiagramm*, total stehengeblieben, obwohl speziell diese Techniken praxisorientierte und allgemein verständliche Lösungen anbieten.

Die Entwicklung und Einführung der Netzplantechnik hat unbestreitbar wegweisende Impulse für das *Verständnis der Terminplanung* gebracht. Auch hat sich die Anwendung der Netzplantechnik in verschiedenen Gebieten gut eingeführt und bewährt. Jedoch lassen sich eindeutig auch Projektbereiche erkennen, wie z. B. *Grossprojekte der Kraftwerksindustrie*, welche die Randbedingungen zur Anwendung der Netzplantechnik als umfassendes Planungsinstrument nicht erfüllen.

In der jüngsten Weiterentwicklung der gängigen Netzplanprogramme ist auch ein eindeutiger Trend in Richtung bessere Lesbarkeit und übersichtlichere Darstellung der Termine feststellbar, d. h. die durch die Netzplanberechnung

ermittelten Termine werden vermehrt in geplotteten oder geprinteten Balkendiagrammen dargestellt.

Probleme bei der Anwendung der bekannten Planungshilfsmittel

Bei der Anwendung der verschiedenen Planungshilfsmittel über mehrere Jahre hinweg wurden diverse *Probleme* festgestellt, mit denen der Planer bei der Durchführung seiner Tätigkeit konfrontiert ist. So müssen bei der Anwendung von Hand betriebener Planungshilfsmittel grosse Zeichneraufwendungen in Kauf genommen werden, was zum vornherein zu einem gewissen *Zielkonflikt* führt, nämlich *zeitgerecht Terminpläne zu erstellen*. Für grössere Projekte können deshalb solche Planungshilfsmittel nur noch beschränkt eingesetzt werden, obwohl z. B. das Balkendiagramm oder der zeitmassstäbliche Netzplan bei den Projektbeteiligten sehr begrüsst werden.

Für die Projektabwicklung von Grossprojekten standen deshalb vor allem *EDV-Netzplanprogramme* im Vordergrund, die erfahrungsgemäss mit gewissen *Nachteilen* behaftet sind:

- Die Anwendung der Netzplantechnik mit EDV-Programm stösst nur bei einem kleinen Teil von Projektleitern, Objektleitern und Sachbearbeitern auf aktive Unterstützung; dadurch wird die Terminplanung in Frage gestellt.
- Der Planer ist bei der Anwendung der Netzplantechnik mit vielen EDV-technischen Fragen konfrontiert und kann sich somit den echten Problemen der Terminplanung und Terminüberwachung nicht mehr in genügendem Ausmass widmen.
- Die logische Verknüpfung der Tätigkeiten zu einem zusammenhängenden Netz ist in der Detailplanung von

Bauprojekten nur für einen kleinen Teil der Tätigkeiten gegeben, d. h. der grösste Teil der Verknüpfungen muss nur deshalb formuliert werden, um das Netz überhaupt rechnen zu können.

- Die Zeitspanne zwischen festgestellter Abweichung im Netzplan, Datenaufbereitung und Datenausgabe mit Computerprogramm ist relativ gross, was sich auch in den Rechnungskosten niederschlägt.
- Die Darstellungsformen der Netzplantechnik sind öfters umstritten.

Aus dieser Situation heraus und aus einem echten Bedürfnis, auch für *kleine und mittlere Projekte* mit *vernünftigen Zeitaufwand* Balkendiagramme erstellen zu können, fasste man den Entschluss, ein Planungsprogramm auf der Basis der Balkendiagramm-Technik zu entwickeln.

Balkplot – Programmgrundlagen

Anforderungen und Basis des Programmes

Für die Programmentwicklung wurden die folgenden *Forderungen* zugrunde gelegt:

- Als Planungsbasis eine leichtverständliche, bewährte und praxisnahe Planungstechnik
- Eliminieren des zeitraubenden Zeichneraufwandes
- kurze Zeitspanne zwischen Terminplanentwurf und Terminplanherausgabe
- Anwendung des Programmes durch Büropersonal (ohne EDV-Vorkenntnisse) und damit Entlastung des Planers von EDV-technischen Problemen
- Bausteinartiger Aufbau des Programmes zum flexiblen Einsatz für verschiedenartige Projekte
- Einbezug der Grundelemente der Netzplantechnik, wie Ablauflogik
- lesbares Output-Angebot, das nicht zuerst interpretiert werden muss

Als Planungsbasis wurde das leichtverständliche Balkendiagramm gewählt, und zwar diejenige Form, bei der verschiedene Tätigkeiten auf einer Linie dargestellt werden. Mit der Wahl dieser Programmbasis sind bereits gewisse Elemente der Netzplantechnik eingebaut.

EDV-technische Grundlagen

Das Computerprogramm Balkplot wurde vorerst zur firmeninternen Anwendung konzipiert und basiert demzufolge auf der hier installierten EDV-Hardware/Software. Als zentrale Computer-

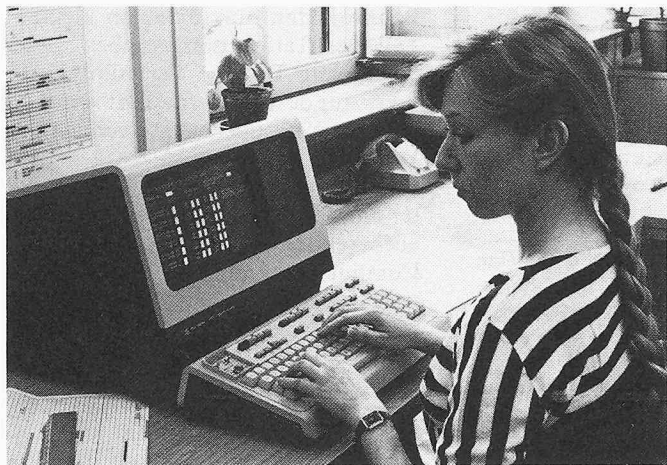


Bild 1. Der Zugriff zum Programm Balkplot erfolgt über dezentral verteilte Bildschirmterminals

TITELKOPF - DATEN (01)		VC1001
ARCH.-ING.	I	PLAN-
KUNDE	I	INFORMATION
SUB-ARCH. INGI	I	
1.) ARCH.-ING 1. MOTOR COLUMBUS 2. INGENIEURUNTERNEHMUNG AG		
2.) SUB ARCH.-ING 1. PARKSTRASSE 2. 5401 BADEN		
3.) KUNDE * 1. BBR 2. KKW MUELHEIM-KAEPFICH		
4.) TITEL 1. AUSLEGUNG NEBEN-UND KLEINLEITUNGEN 2. INNERHALB SICHERHEITSBEHALTER 3. PLANPAKET 1		
5.) PLAN-INFO 1. DETAILTERMINPLAN 40 2. NR. 12.0557.05.011 REV. 1 3. DAT: 31.03.82 VIS:FRR 4.		

Bild 2. Alle Programmschritte werden an Hand von selbsterklärenden «Masken» mit vorgegebenen Datenfeldern am Bildschirmterminal durchgeführt

einheit steht ein Prime 400 zur Verfügung, der über ein grosses Netz von dezentral verteilten Bildschirmterminals einen Dialog im Timesharing-Betrieb gestattet (Bild 1). Als Datenausgabe-Geräte sind Printer, Plotter und Graphikterminals vorhanden.

Basierend auf dieser Hardware-Konfiguration wurde das Programm Balkplot in der Programmiersprache Fortran IV geschrieben. Es wurde vor allem darauf geachtet, für die Programmanwendung einen hohen Benützungskomfort zu erreichen. So wurde z. B. ein spezielles Software-Paket eingebaut, das die Steuerung aller Programmschritte über selbsterklärende «Masken» (Bild 2) gestattet.

Programmbeschreibung

Balkplot ist ein umfangreiches Programmpaket, das alle Planungsbereiche enthält, die zu einem vollständigen Planungshilfsmittel gehören, nämlich (Bild 3):

- Terminplanung mit Balkendiagramm
- Einsatzmittelplanung (Kapazitäts- und Kostenplanung)
- Fortschrittsüberwachung
- Kritische Pfad-Analyse.

Zusätzlich wurde ein Programmteil dazugefügt, der den selektiven Zugriff zu den Daten von verschiedenen Balkendiagrammen gestattet.

Die verschiedenen Programmteile können je nach Projektbedürfnis wahlweise eingesetzt werden, wobei das Balkendiagramm immer als Basis vorhanden sein muss.

Terminplanung mit Balkendiagramm

Für die Erstellung eines Balkendiagrammes müssen zwei Programmschritte durchlaufen werden (siehe Bild 3):

- Erstellen bzw. Mutation der Datenbank.
- Zeichnen des Balkendiagrammes aufgrund der Datenbank und den gewünschten Output-Anforderungen.

Erstellung der Datenbank

Um eine übersichtliche Programmhandhabung bei der Dateneingabe zu gewährleisten, wurde der Inhalt des Balkendiagrammes (Bild 4) in artgleiche Datenelemente unterteilt.


Die erste Gruppe enthält die Textteile des Balkendiagrammes:

- **Titelkopf** zur Eingabe von Projektbezeichnung, Kunde, usw.
- **Tätigkeiten/Untertitel** mit zusätzlichen Kolonnen zur Angabe von Nummern, Prioritäten und Verantwortlichkeiten. Tätigkeitsgruppen können als Untertitel (grössere Schrift) hervorgehoben werden.
- **Legende** zur Beschreibung der im Balkendiagramm verwendeten Signaturen.

Eine zweite Gruppe enthält alle Datenelemente, die für den Termin-Bereich des Balkendiagrammes erforderlich sind:

- **Balken/Ereignis** zur Darstellung des zeitlichen Ablaufes mit verschiedenen Balken- und Ereignis-Signaturen (max. 12 je Tätigkeitslinie). Eine grosse Auswahl von diversen Signaturen gibt die Möglichkeit, typische Tätigkeitsabläufe standardisiert dar-

Bild 3. Übersichtsschema zum Programmaufbau

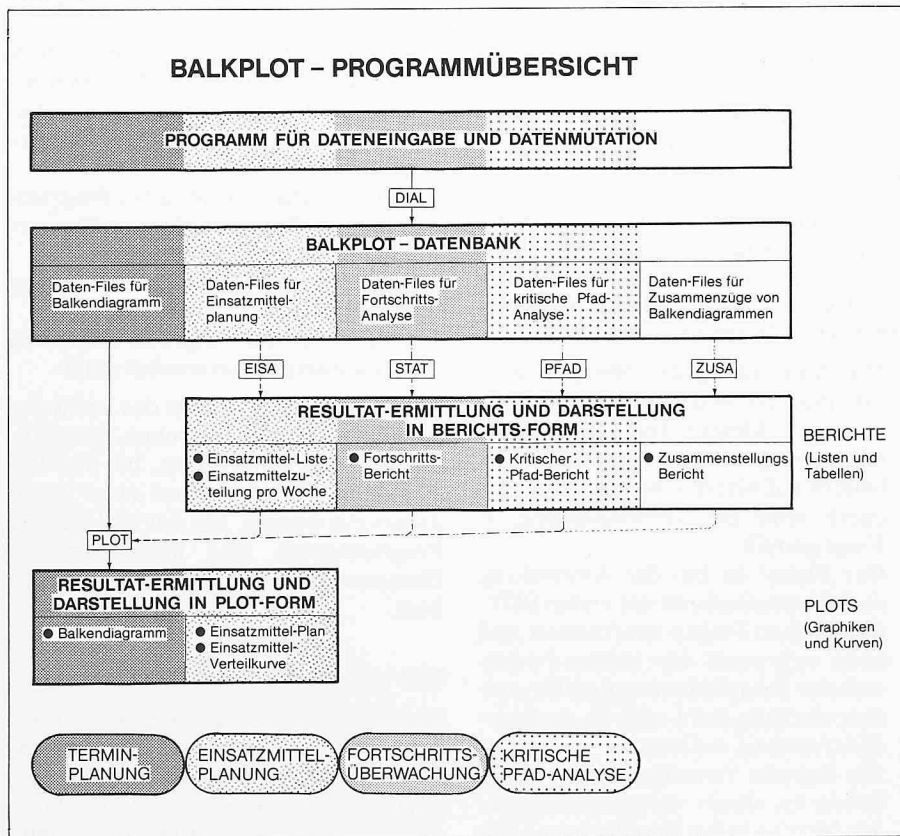

zustellen (Bild 5). Überlappende Tätigkeitsbalken sind ebenfalls zulässig.

- **Abhängigkeit** zur Darstellung von wichtigen Verknüpfungen über verschiedene Tätigkeitslinien.
- **Bemerkung** als Überschrift über Balken oder als Beschreibung von speziellen Ereignispunkten.

Die Zeituordnung dieser drei Datenelemente wird mit Wochen-Nummer und Jahr vorgenommen.

Mit einem weiteren Datenelement **Plotreihenfolge** kann die Reihenfolge der Tätigkeitslinien beliebig festgelegt oder geändert werden.

Darstellung des Balkendiagrammes

Ausgehend von der erstellten Datenbank kann das Balkendiagramm mit diversen Parametern je nach Projektbedürfnis verschiedenartig dargestellt werden:

- **Zeichnungsformate** (Bild 6): einerseits festbegrenzte Formate wie A3-hoch, A3/A2-quer mit Folgeblättern oder andererseits Formate mit variabler Länge (je nach Anzahl der Tätigkeitslinien, max. 120) und zwar in der Breite des A3- und A2-Formates.
- **Zeitmassstäbe** (Bild 6): zur Gestaltung des Termin-Bereiches können fünf verschiedene Zeitraster verwendet werden, die von einem 1/2-Wochenraster bis zu einem 2-Monatsraster reichen. Zusätzlich können auch drei verschiedene Zeitraster mit relativem Kalender gewählt werden, um Abläufe losgelöst von effektiven Zeiten darzustellen.
- **Der Termin-Bereich** kann beliebig ausgewählt werden, indem der Anfangspunkt mit Wochen-Nummer und Jahr festgelegt wird. Der Umfang des Termin-Bereiches wird dann durch das Zeichnungsformat und den Zeitmassstab bestimmt.

Durch die Kombination der verschiedenen Zeichnungsformate und Zeitmassstäbe ergibt sich ein breites Spektrum von Darstellungsmöglichkeiten. Der Termin-Bereich kann somit im 1/2-Wochenraster ein Jahr umfassen und im 2-Monatsraster siebzehneinhalb Jahre. Dadurch können Balkendiagramme in jedem gewünschten Detaillierungsgrad als Übersichts-, Koordinations- oder Detailterminplan erstellt werden.

Mit weiteren Optionen kann die Darstellung bestimmter Zeichnungselemente unterdrückt werden, so z. B. Vertikalraster, Horizontalraster, Projektstandlinie, Texte im Titelkopf, Beschriftung im Massstabkopf, Darstellung der Legende, Verantwortungskolonne, usw.

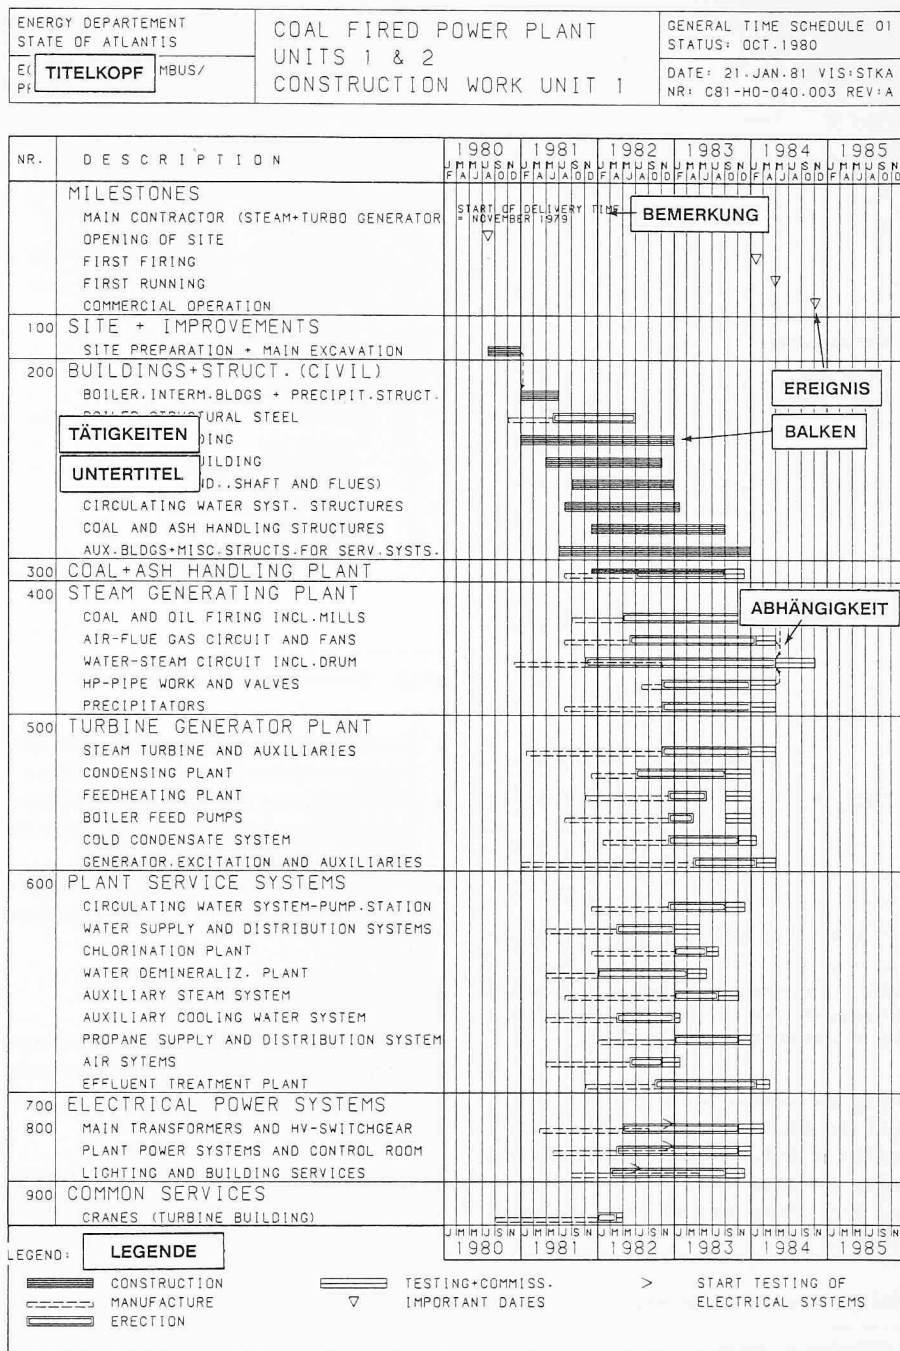


Bild 4. Balkendiagramm mit den verschiedenen Datenelementen

Einsatzmittelplanung (Kapazitäts- und Kostenplanung)


Für grössere Projekte genügt es nicht, nur **Terminpläne** zu erstellen. Es ist unbedingt erforderlich, die im Terminplan festgelegten Tätigkeitsabläufe auf Kapazitätsbedarf zu überprüfen und dem tatsächlichen Kapazitätsangebot gegenüberzustellen. Auftretende Kapazitätsspitzen sind dann durch sinnvolle Änderungen im Terminplan auszugleichen.

In den meisten Fällen ergibt sich erst nach einer Einsatzmittelanalyse ein umfassender Überblick, welche und wieviele Einsatzmittel zur Realisierung des geplanten Terminablaufes notwendig sind. Nur wenn Dauer und Kapazität übereinstimmen, steht die Termin-

planung bzw. die Dauer der einzelnen Tätigkeiten auf einer gesicherten Basis.

Um diese Aufgabenstellung effizient zu lösen, wurde zum bestehenden Terminplanungsprogramm ein **Zusatzprogramm** geschaffen, mit dem die Zuord-

Bild 5. Standard-Darstellung von typischen Tätigkeitsabläufen

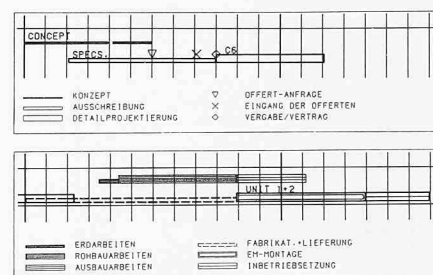

rung im Balkendiagramm vorgenommen werden.

Die Einsatzmittel-Verteilung kann auch als Summenkurve dargestellt werden, was vor allem zur Darstellung von Kosten-Verteilungen gedacht ist. Mit dieser Darstellungsart können aber auch Soll/Ist-Vergleiche über verschiedene Einsatzmittel vorgenommen werden.

Der *Einsatzmittel-Plan* (Bild 9, rechter Teil) gibt eine graphische Darstellung der gewünschten Einsatzmittel je Tätigkeitslinie mit entsprechenden Subtotalen oder Total-Summen in horizontaler oder vertikaler Richtung.

Um eine übersichtliche Zusammenstellung der Information aus Terminplanung und Einsatzmittelplanung zu erreichen, können das Balkendiagramm, die Einsatzmittel-Verteilkurven und der Einsatzmittel-Plan in einer Plot-Darstellung gezeichnet werden (Bild 9).

Fortschrittsüberwachung

Die Terminplanung und Einsatzmittelplanung dürfen keine statischen Planungselemente bleiben. Im Gegenteil ist es notwendig, in periodischen Zeitabständen (z. B. jeden Monat), den Projekt-Fortschritt aufgrund der vorgegebenen Planung (Balkendiagramm und Einsatzmittel-Verteilung) zu kontrollieren. Bei festgestellten Terminabweichungen können dadurch rechtzeitig

korrektive Massnahmen eingeleitet werden. Um diese Problemstellung zu lösen, enthält Balkplot ein Zusatz-Programm, das einerseits den Projektstand ermittelt und andererseits den Projektfortschritt der vergangenen Berichts-Periode in verbaler Form erfasst.

Es sind im wesentlichen zwei Datenelemente zur bestehenden Datenbank hinzuzufügen:

- *Projekt-Status*: Angabe des Ausführungsstandes der einzelnen Tätigkeitsbalken als %-ausgeführt oder als Restdauer.
- *Nachführungs-Bemerkungen*: 3zeilige Beschreibung des Bearbeitungsstandes der einzelnen Tätigkeiten (z. B. Kurzbegründungen bei Terminabweichungen, Probleme, wichtige Ereignisse, Prognosen usw.)
- Weitere, sekundäre Datenelemente, wie z. B. Titelblatt, Auftragsbezeichnung, Liste der Verantwortlichen, usw.

Im *Fortschritts-Bericht* (Bild 10) werden nun die Ergebnisse der Fortschritts-Analyse dargestellt. Dieser Bericht bringt im linken Teil eine Auflistung der Tätigkeiten analog zum Balkendiagramm und schafft somit einen klaren Bezug zum Terminplan.

Auf einer zweiten Linie wird der Ausführungsstand des Tätigkeitsbalkens

mit folgenden Parametern dargestellt: Ausführungsstand in Prozenten jetzt und Vormonat, Restdauer der Tätigkeit in Wochen und Abweichung von Planvorgabe. Im rechten Teil des Berichtes werden auf drei Zeilen je Tätigkeitslinie die Nachführungs-Bemerkungen gedruckt. Der Fortschritts-Bericht kann entweder in der gleichen Tätigkeitsreihenfolge wie im Balkendiagramm ausgegeben werden oder selektiert nach den Verantwortlichen.

Der somit ermittelte Projektstand kann nun im Balkendiagramm automatisch als Projektstandslinie (Bild 9) gezeichnet werden und gibt dadurch einen Überblick, was noch auszuführen ist. Terminabweichungen lassen sich dadurch sofort erkennen.

Kritische Pfad-Analyse

Um die Vorzüge der Netzplantechnik speziell bezüglich Ablauflogik anzuwenden, kann mit einem weiteren Programmteil eine Verknüpfungsstruktur auf das bestehende Balkendiagramm überlagert werden, wobei man sich hier auf die wesentlichen und auch notwendigen Verknüpfungen beschränken kann. Durch Vorgabe der verbindlichen Projektecktermine können nun die kritischen Pfade bestimmt werden. Des weiteren ist es möglich, aufgrund von festgestellten Terminabweichungen bei der Fortschrittsüberwachung

Bild 10. Fortschritts-Bericht

ELEKTRIZITAETS AG KRAFTWERK STEIN - ERWEITERUNG KUEHLTURM				F O R T S C H R I T T S - B E R I C H T ZUM DETAILTERMINPLAN NR.1029-11 REV.D STAND: 26.WOCHE 1980				PAGE 1 RUN DATE 03.05.82 BALKP-NR. 06 SUB-UFD TEST-BALKP>
REC NR.	NR.	O B J E K T / T A E T I G K E I T	VER :	BEARBEITUNGSSTAND / PENDENZEN / BEMERKUNGEN				STAND
		* T A E T I G K E I S B A L K E N	AUSGEFUEHRT: REST-; ABWEI- : 21.KW: 26.KW: DAUER: CHUNG :					
1 :		EINGABEPROJEKT 1:100	GPI :	-Das Eingabeprojekt 1:100 ist fertiggestellt und wurde				Erl.
		* PROJEKT./AUSSCHREIB.: 100% : 100% :	OW :	termingerecht an das Bauamt zur Pruefung eingereicht.				
2 :		GENEHMIGUNG BAUAMT ZUERICH	BEY :	-Die Erteilung der Genehmigung hat sich aus politischen				Bear
		* VORPRUEFUNG : 67% : 89% :	1W - 2W :	Gruenden verzoeigert: neuer Genehmigungstermin = 27.KW				
3 :	01	VERBINDUNGSKANAL						
4 :		B A U T E I L						
5 :		BAUPROJEKT 1:50	GPI :	-Das Bauprojekt 1:50 wurde mit 2 Wochen Verspaetung am				Erl.
		* PROJEKT./AUSSCHREIB.: 86% : 100% :	OW :	3.Juni 80 abgeschlossen und an die Beton-Bau AG weiter-				
				geleitet: Verzoeigerung kann aufgefangen werden.				
6 :		DETAILPLAENE GRUNDWASSERISOLIERUNG	BBU :	-Sind abgeschlossen und wurden bereits in der 26.KW an das				Erl.
		* DETAILPROJEKTIERUNG : 20% : 100% :	OW :	Bauamt eingereicht.				
7 :		SCHALUNGSPLAENE	BBU :	-Wegen Zeichner-Kapazitaetsengpass verzoeigert: koennte den				Bear
		* DETAILPROJEKTIERUNG : 20% : 65% :	3W - 1W :	Endtermin gefaehrden.				
8 :		STATIK + ARMIERUNGSPLAENE	BBU :	-Ebenfalls Kapazitaetsprobleme mit Zeichnern: koennte den				Bear
		* DETAILPROJEKTIERUNG : 0% : 40% :	3W - 1W :	Endtermin gefaehrden.				
9 :		BAU VERBINDUNGSKANAL	BBU :	-Event. verzoeigert Baubeginn wegen verspaeteten Schalungs-				Pend
		* BAUARBEITEN : : 0% : 5W :		und Armierungsplaenen.				
10 :		E M - A U S R U E S T U N G						
11 :		KUEHLWASSERLEITUNGEN	RL :	-Die Vorpruefunterlagen konnten bereits in der 26.KW abge-				Erl.
		* DETAILPROJEKTIERUNG : 0% : 100% :	OW : + 1W :	schlossen werden und werden naechste Woche an die Pruef-				
				stelle gesandt.				

die Auswirkungen auf die kritischen Pfade zu überprüfen.

Die kritischen Pfade werden im Balkendiagramm mit Verbindungspfeilen und speziellen Markierungen der Tätigkeitsbalken gekennzeichnet, damit die Prioritäten in der Projektabwicklung erkennbar werden.

Der Programm-Teil *Kritische Pfad-Analyse* ist zur Zeit in dieser Form noch nicht implementiert: zur Darstellung von wichtigen Abhängigkeiten stehen jedoch im Balkendiagramm die Verbindungspfeile zur Verfügung.

Zusammenzüge von Balkendiagrammen (Re/Organisations-Programm)

Die Projekte der Kraftwerkindustrie haben eine solche Grösse und Komplexität, dass man gezwungen ist, den Projektlauf mit *mehrstufigen Terminplanungssystemen in verschiedenen Teilterminplänen* darzustellen. Das hat zur Folge, dass für ein Grossprojekt z. B. 10 bis 15 verschiedene, nach Objekten aufgegliederte Terminpläne (Balkendiagramme) bestehen. Um sich gleichwohl den Zugriff zu den verschiedenen Balkendiagrammen sicherzustellen, wurde ein Zusatzprogramm geschaffen, das die nachfolgend beschriebenen Funktionen ausführen soll:

- Zusammenstellen von Auszügen aus verschiedenen Balkendiagrammen,
- Zusammenstellen von verschiedenen (ganzen) Balkendiagrammen,
- Trennen eines Balkendiagramms in mehrere Balkendiagramme.

Zusammenstellen von Auszügen aus verschiedenen Balkendiagrammen

Mit dieser Programm-Option ist es möglich, aus mehreren Balkendiagrammen gewisse Tätigkeitslinien nach bestimmten Auswahlkriterien auszuwählen und in einem neuen Balkendiagramm darzustellen. Als *Auswahlkriterien* (Selektierung) stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Tätigkeits-Nummern in den verschiedenen Balkendiagrammen,
- beliebige Textzeichen in der Tätigkeitsbeschreibung (z. B. Verantwortlichkeit),
- bestimmte Balken-Typen.

Mit diesen Selektierungsmöglichkeiten können z. B. für Grossprojekte mit verschiedenen, nach Objekten aufgeteilten Balkendiagrammen *Zusammenzüge* für einzelne Disziplinen erstellt und gezeichnet werden (Bild 11). Des weiteren ist es auch möglich, aus einem bestehenden Balkendiagramm, das die Planungs- und Ausführungsphase abdeckt, nur einen Auszug über den Planungs- teil zu erstellen und zu zeichnen.

Zusammenstellen von verschiedenen (ganzen) Balkendiagrammen

Mit dem *Zusammenstellungs-Programm* können auch verschiedene, vollständige Balkendiagramme zusammengezogen werden, damit eine Einsatzmittel-Analyse über ein ganzes Grossprojekt (mit verschiedenen Teilterminplänen) ausgeführt werden kann.

Trennen eines Balkendiagramms in verschiedene Balkendiagramme

Entsprechend den obgenannten Selektierungs-Möglichkeiten lässt sich auch ein bestehendes Balkendiagramm in verschiedene Balkendiagramme aufteilen.

Vorzüge der Balkplot-Anwendung

Aufgrund von zahlreichen Anwendungen seit Mitte 1979 konnten bei der Planung verschiedener Projekte bemerkenswerte Verbesserungen und Vereinfachungen festgestellt werden, die im nachfolgenden Abschnitt in den Hauptzügen dargestellt sind.

Flexibel in der Anwendung für Projekte verschiedener Grösse


Wegen dem bausteinartigen Aufbau des Programmes ist es möglich Balkplot als umfassendes Planungsinstrument für kleine und einfache Projekte wie auch für grosse und komplexe Projekte anzuwenden. Für kleine Projekte kann z. B. nur die *Terminplanung* und die entsprechende *Fortschrittsüberwachung* angewendet werden. Bei Grossprojekten mit mehreren Balkendiagrammen kann zusätzlich der Programmteil *Einsatzmittelplanung* einbezogen werden, um die Terminplanung auf eine gesicherte Basis bezüglich Kapazitätsbedarf zu stellen.

Mit Balkplot können Terminpläne für alle Planungsstufen erstellt werden, so z. B. Übersichtsterminpläne, Koordinationsterminpläne und Detailterminpläne. Balkplot ist auch sehr flexibel, wenn es gilt, die Terminplanung eines Projektes von der Konzeptphase in die Detailphase überzuführen, kann doch mit dem *Zusammenstellungsprogramm* die bestehende Planung beliebig erweitert, neu zusammengestellt oder getrennt werden.

Äusserst kurze Verarbeitungszeit mit bescheidenem Kostenaufwand

Durch die Anwendung von Balkplot wird der zeitraubende Zeichneraufwand hinfällig. Lediglich ein bescheidener Aufwand für die Dateneingabe ist erforderlich, um je nach Verfügbarkeit

KOORDINATIONS-TERMINPLÄNE PRO OBJEKT (SYSTEM)

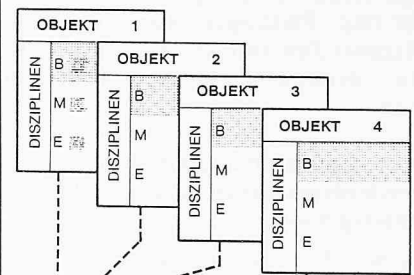

TERMINPLÄNE PRO DISZIPLIN




Bild 11. Mögliche Zusammenstellung von Balkendiagrammen: Selektierung nach Disziplinen

des Zeichnungsgerätes, Balkendiagramme von 120 Tätigkeitslinien innerhalb zwei bis drei Stunden zu erstellen. Falls nur eine Überarbeitung eines bestehenden Balkendiagrammes notwendig ist, so ist der Zeitaufwand noch geringer. Des weiteren lassen sich mit einem zusätzlichen Aufwand von *nur* ein bis zwei Stunden verschiedene Einsatzmittel-Verteilkurven aufzeichnen, die eine anschauliche Beurteilung des Kapazitätsbedarfes ermöglichen.

Gesamthaft betrachtet bietet also Balkplot die Möglichkeit termingerecht Terminpläne zu erstellen. Die anfallenden Kosten für Dateneingabe und Outputerstellung liegen in angemessenem Rahmen.

Entlastung des Planers von Routearbeit oder grossem EDV-technischem Aufwand

Während bei der Netzplantechnik der Planer sich auch sehr stark mit EDV-technischen Belangen befassen muss, wie z. B. Umsetzen der Information in Ablochbelege, Rechnungsläufe mit Fehleranalyse und Interpretation der Ergebnisse, so ist der EDV-Arbeitsaufwand bei der Balkplot-Anwendung relativ gering.

Der Planer hat lediglich aufgrund der geänderten Planungsvorgaben die bestehenden Balkendiagramme mittels Handeintragungen anzupassen. Die nachfolgende Daten-Eingabe/Mutation und die Erstellung der neuen Balkendiagramme kann einem Planungs-

assistenten oder auch Büropersonal überlassen werden. Für die Programm-anwendung sind nur minimale EDV-Kenntnisse notwendig, die sich der Planer resp. Planungsassistent innerhalb kürzester Zeit an Hand eines instruktiven Benützerhandbuches erwerben kann.

Aktive Unterstützung durch die verschiedenen Projektstellen bei der Projektplanung

Da das Planungs-Programm auf dem Balkendiagramm aufgebaut ist, wird auch die Zusammenarbeit des Planers mit allen Projektstellen auf eine einfache Basis gestellt. Die Ergebnisse des Planers sind in leichtverständlichen Diagrammen, Kurven oder Berichten dargestellt und informieren auf anschauliche Weise die Projektbeteiligten. Somit ist auch die Diskussionsbasis

geschaffen um bestehende Planungsprobleme zu lösen.

Idealer Zusammenhang von Termin- und Einsatzmittelplanung

Das Balkendiagramm bietet für die Anwendung der Einsatzmittelplanung eine ideale Bezugsbasis und bringt mit dem Einsatz von Balkplot auch eine sehr übersichtliche und zusammenhängende Darstellung der Resultate aus Termin- und Einsatzmittelplanung. Mit Balkplot besteht auch die Möglichkeit, *gleichzeitig* mit der Erstellung eines Terminplanes, die Einsatzmittelplanung mitzuziehen. Damit kann man sich laufend einen Überblick über den erforderlichen Kapazitätsbedarf verschaffen und kann somit sich abzeichnende Kapazitätsspitzen schon während der Erarbeitung des Terminplanes ausgleichen.

Schlussbemerkungen

Mit dem beschriebenen Planungsprogramm Balkplot wurde das Balkendiagramm, ein altbewährtes Planungshilfsmittel, entscheidend weiterentwickelt. Damit ist ein einfaches und praxisorientiertes Planungsinstrument geschaffen, das die Belange des Projektmanagements wirkungsvoll unterstützt. Um aber eine erfolgreiche Projektabwicklung sicherzustellen, müssen nebst einem handlichen Planungshilfsmittel auch die entsprechenden personellen und organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Adresse der Verfasser: K. Staub, W. Landolt und R. Lang, c/o Motor-Columbus Ingenieurunternehmung AG, Parkstr. 27, 5401 Baden.
